
№ · панель · от запада / от юга, мм · Ø · что

```
01 П-04А    117 /   428   125  К1 канализация ПП 110 (стояк) (Ст К1-1)
02 П-05Б    538 /  1797    60  Э  ввод кабеля ВБбШв 3×16 в стальной трубе ВГП Ду
03 П-05Б    962 /    98   125  В1 ввод воды ПНД 32 в гильзе ПНД 110 (В1-1)
```

Дублин — карта отверстий в панелях пола СИП 224 (вид сверху, после укладки)

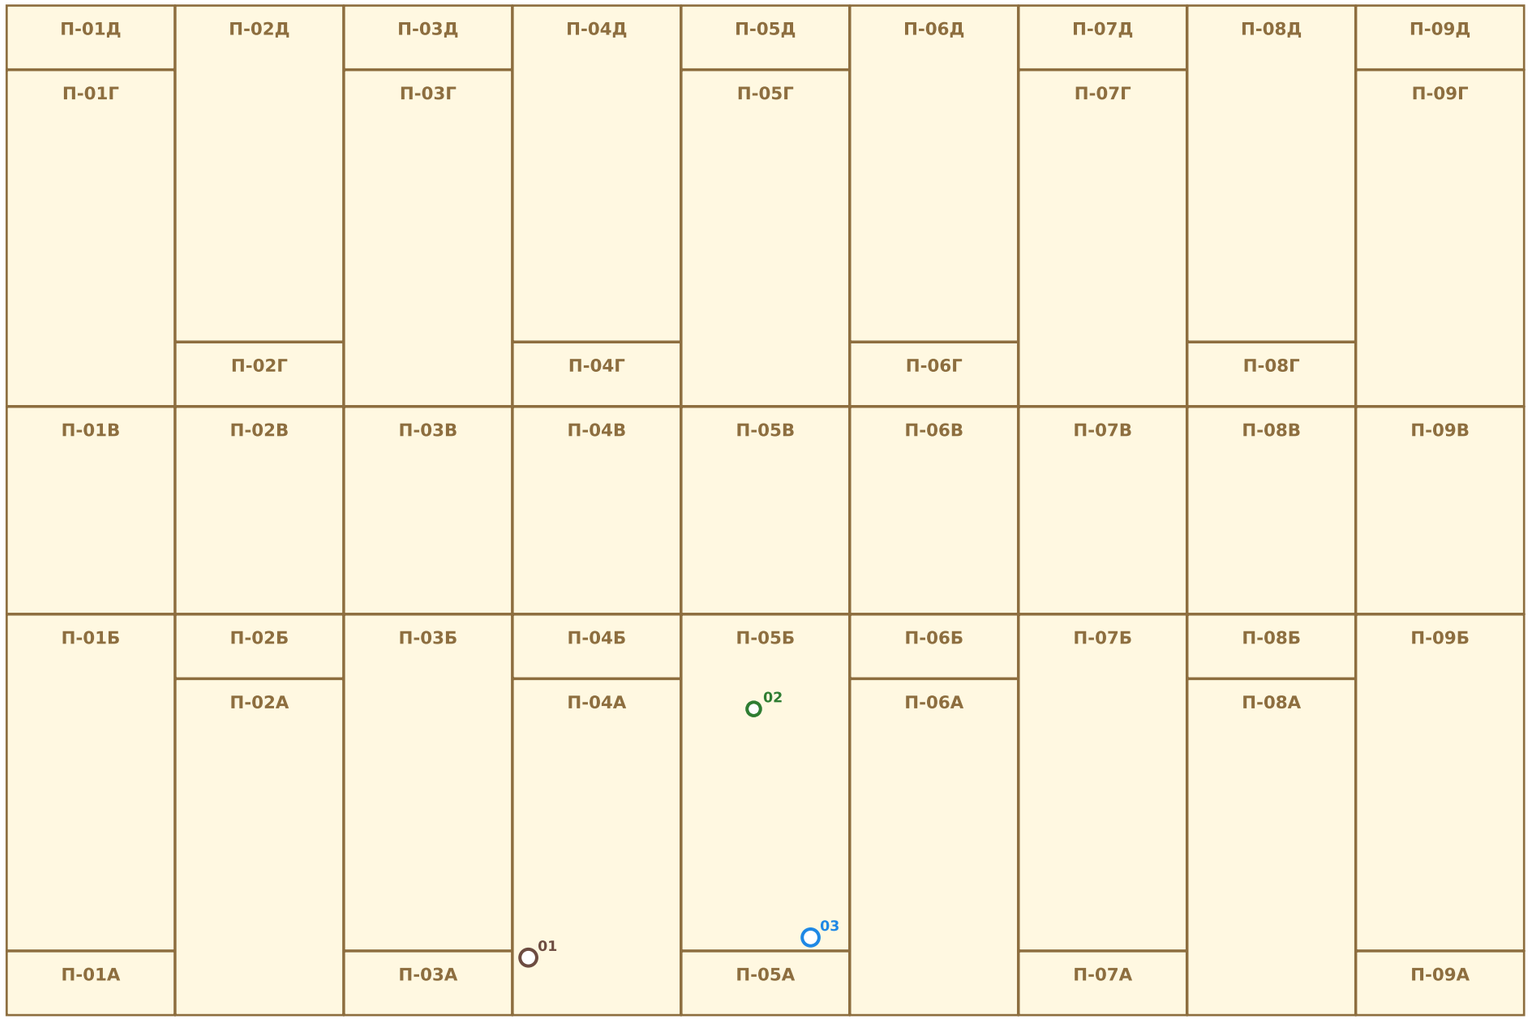

Сплошной кружок — в обоих пакетах, пунктир — только в одном (см. таблицу). Ø32 — 1–2 рукава, Ø40 — 3 и более (электрика); вода PPR — Ø40 под гильзу;
К1 50 — Ø63, стояк 110 и ввод воды — Ø125; ввод кабеля — Ø60. Сверлить сверху коронкой строго вертикально по метке; панели под перегородками Б и В не сверлить (обвязка). ⚠ — у шва панелей.
