
Стена А (юг) — каркас из досок и раскладка панелей СИП 174 (вид снаружи с юга)




Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-1.01	45×145	1678	верх проёма ОП-03
БС-1.02	45×145	1678	низ проёма ОП-03
БС-1.03	45×145	633	верх проёма ОП-01
БС-1.04	45×145	633	низ проёма ОП-01
БС-1.05	45×145	633	верх проёма ОП-01
БС-1.06	45×145	633	низ проёма ОП-01
БС-2.01	45×145	2460	стык панелей x = 7.925 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.02	45×145	2460	стык панелей x = 9.638 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.03	45×145	2460	стык панелей x = 6.274 = стойка проёма ОП-01, на всю вы…
БС-2.04	45×145	2460	стык панелей x = 6.942 = стойка проёма ОП-01, на всю вы…
БС-2.05	45×145	2460	стык панелей x = 3.960 = стойка проёма ОП-01, на всю вы…
БС-2.06	45×145	2460	стык панелей x = 4.628 = стойка проёма ОП-01, на всю вы…
БС-2.07	45×145	2460	стык панелей x = 1.252

Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-2.08	45×145	2460	стык панелей x = 2.507
БС-2.09	45×145	2460	стык панелей x = 3.762
БС-2.10	45×145	2460	стык панелей x = 5.017
БС-2.11	45×145	2460	стык панелей x = 7.527
БС-2.12	45×145	2460	стык панелей x = 10.037
БС-3.01	20×145	6000	лежень (низ стены)
БС-3.02	20×145	5290	лежень (низ стены)
БС-3.03	20×145	5290	верх стены в пазу
БС-3.04	20×145	6000	верх стены в пазу
БС-4.01	20×145	2460	торцевая доска в паз проходящей панели (угол)
БС-4.02	20×145	2460	торцевая доска в паз проходящей панели (угол)
ВО-1.01	45×195	5290	накладная 45×174 со скосом 20° (распустить из 45×195)
ВО-1.02	45×195	6000	накладная 45×174 со скосом 20° (распустить из 45×195)

Ключ-план (стена — красным)

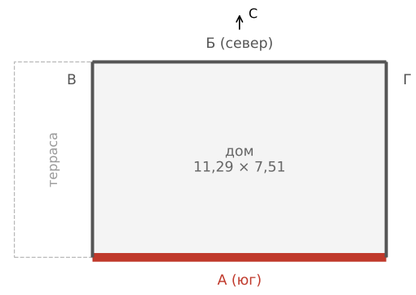

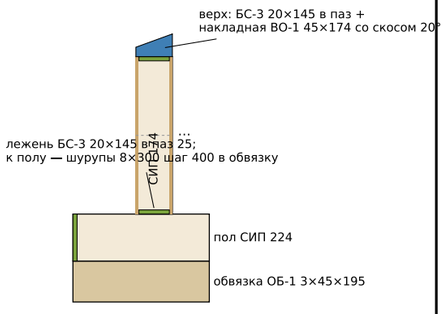

Разрез по стене (схема, без масштаба по высоте)


Итого по стене

- БС-1 — рамка проёма / угловая доска 45×145 (паз 40, выступ 5): 6 шт, 5,89 м
- БС-2 — доска в стыке панелей 45×145: 12 шт, 29,52 м
- БС-3 — лежень / верх стены 20×145: 4 шт, 22,58 м
- БС-4 — торцевая доска 20×145 (угол): 2 шт, 4,92 м
- ВО-1 — накладная 45×174 со скосом (из 45×195): 2 шт, 11,29 м

Марки досок — как в раскрое пиломатериала (листы ПМ, карты досок 6 м).
Марки панелей (серым) — как в карте раскроя СИП.
Длины — по проекту, перед резом сверить по месту.

Дом 45 · «Дублин» (ГП1) · листы стен для бригады	Лист
Стена А (юг): каркас, панели, доски с марками	СТ-1


Стена Б (север) — каркас из досок и раскладка панелей СИП 174 (вид снаружи с севера)

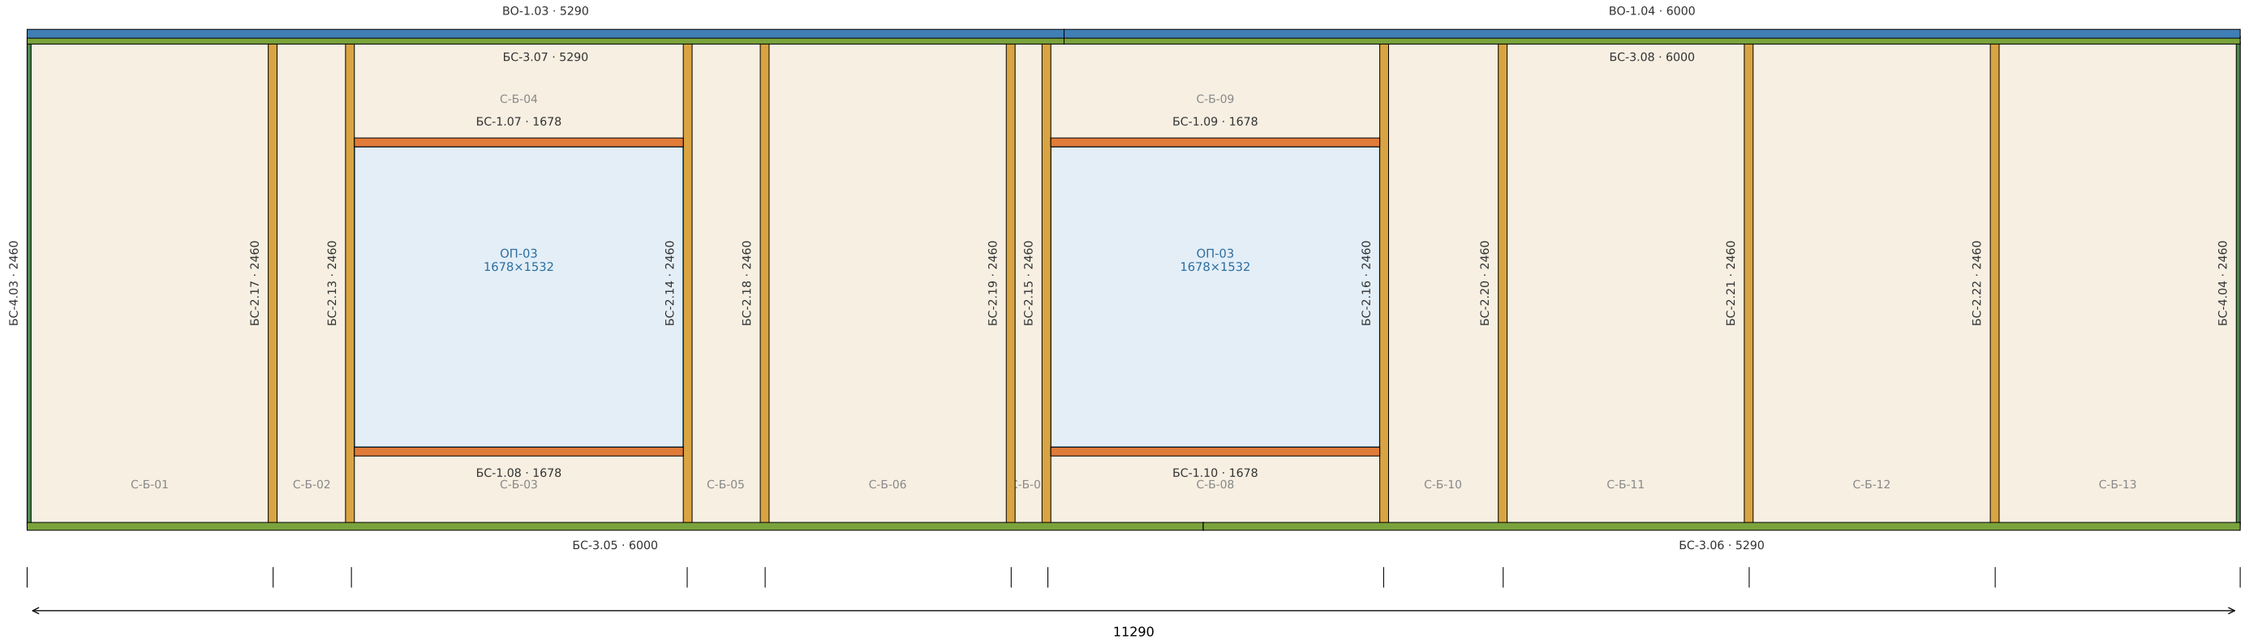


Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-1.07	45×145	1678	верх проёма ОП-03
БС-1.08	45×145	1678	низ проёма ОП-03
БС-1.09	45×145	1678	верх проёма ОП-03
БС-1.10	45×145	1678	низ проёма ОП-03
БС-2.13	45×145	2460	стык панелей x = 1.652 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.14	45×145	2460	стык панелей x = 3.365 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.15	45×145	2460	стык панелей x = 5.205 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.16	45×145	2460	стык панелей x = 6.918 = стойка проёма ОП-03, на всю вы…
БС-2.17	45×145	2460	стык панелей x = 1.252
БС-2.18	45×145	2460	стык панелей x = 3.762
БС-2.19	45×145	2460	стык панелей x = 5.017

Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-2.20	45×145	2460	стык панелей x = 7.527
БС-2.21	45×145	2460	стык панелей x = 8.783
БС-2.22	45×145	2460	стык панелей x = 10.037
БС-3.05	20×145	6000	лежень (низ стены)
БС-3.06	20×145	5290	лежень (низ стены)
БС-3.07	20×145	5290	верх стены в пазу
БС-3.08	20×145	6000	верх стены в пазу
БС-4.03	20×145	2460	торцевая доска в паз проходящей панели (угол)
БС-4.04	20×145	2460	торцевая доска в паз проходящей панели (угол)
ВО-1.03	45×195	5290	накладная 45×174 со скосом 20° (распустить из 45×195)
ВО-1.04	45×195	6000	накладная 45×174 со скосом 20° (распустить из 45×195)

Ключ-план (стена — красным)

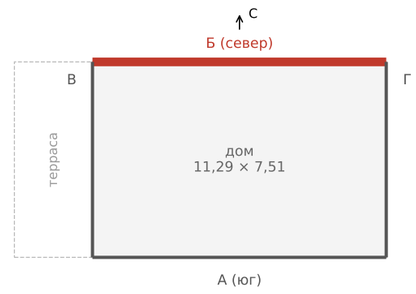

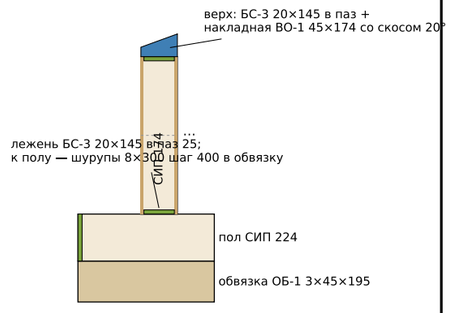

Разрез по стене (схема, без масштаба по высоте)


Итого по стене

- БС-1 — рамка проёма / угловая доска 45×145 (паз 40, выступ 5): 4 шт, 6,71 м
- БС-2 — доска в стыке панелей 45×145: 10 шт, 24,60 м
- БС-3 — лежень / верх стены 20×145: 4 шт, 22,58 м
- БС-4 — торцевая доска 20×145 (угол): 2 шт, 4,92 м
- ВО-1 — накладная 45×174 со скосом (из 45×195): 2 шт, 11,29 м

Марки досок — как в раскрое пиломатериала (листы ПМ, карты досок 6 м).
Марки панелей (серым) — как в карте раскроя СИП.
Длины — по проекту, перед резом сверить по месту.

Дом 45 · «Дублин» (ГП1) · листы стен для бригады	Лист
Стена Б (север): каркас, панели, доски с марками	СТ-2

Стена В (запад, к террасе) — каркас из досок и раскладка панелей СИП 174 (вид снаружи с запада (с террасы))

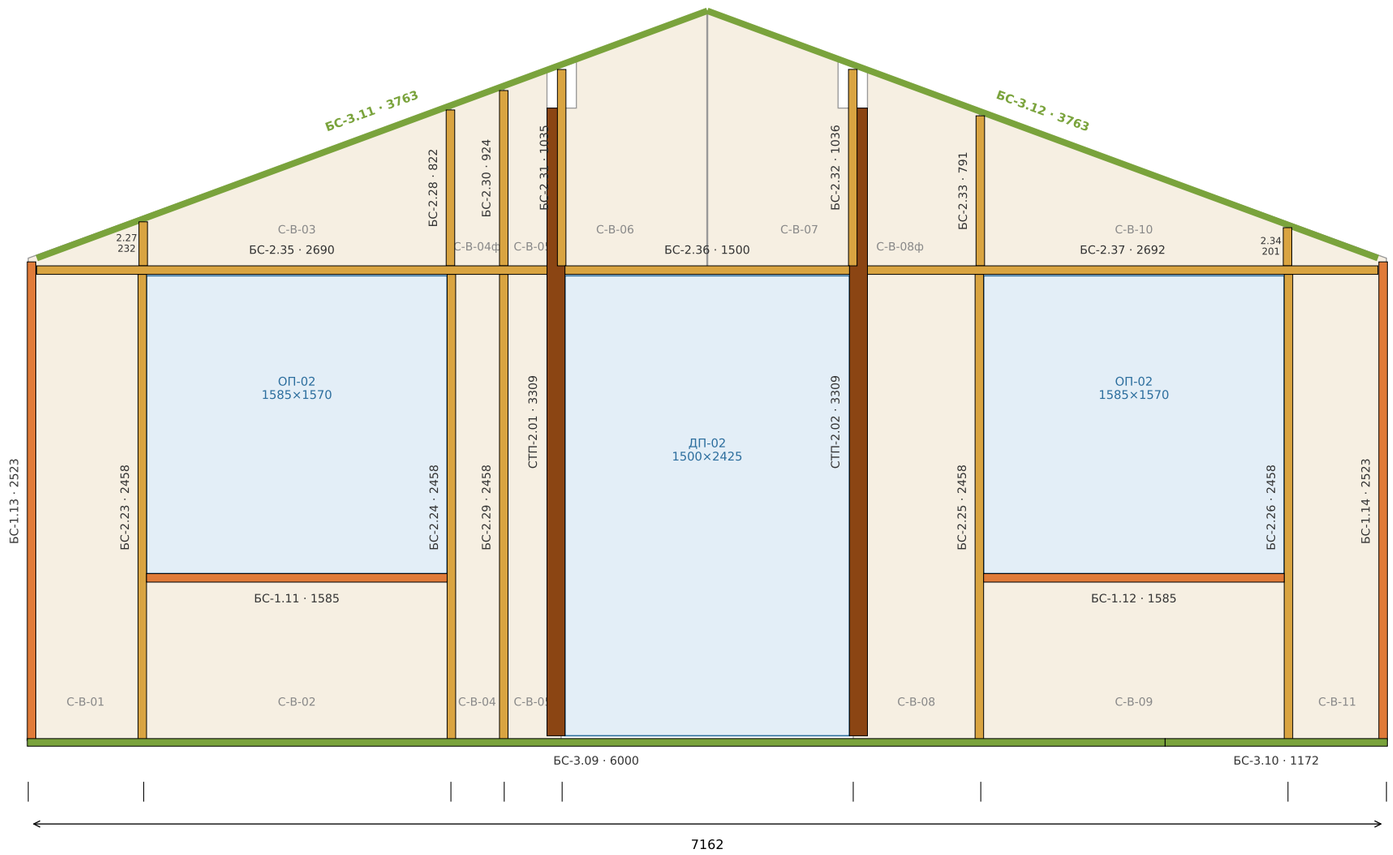


Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-1.11	45×145	1585	низ проёма ОП-02
БС-1.12	45×145	1585	низ проёма ОП-02
БС-1.13	45×145	2523	угловая доска 45×145 (40 в паз 40 торца, выступ 5 до проходящей стены)
БС-1.14	45×145	2523	угловая доска 45×145 (40 в паз 40 торца, выступ 5 до проходящей стены)
БС-2.23	45×145	2458	стык панелей x = 0.606 = стойка проёма ОП-02, на всю высоту
БС-2.24	45×145	2458	стык панелей x = 2.226 = стойка проёма ОП-02, на всю высоту
БС-2.25	45×145	2458	стык панелей x = 5.020 = стойка проёма ОП-02, на всю высоту
БС-2.26	45×145	2458	стык панелей x = 6.640 = стойка проёма ОП-02, на всю высоту
БС-2.27	45×145	232	стык фронтонных деталей x = 0.606
БС-2.28	45×145	822	стык фронтонных деталей x = 2.226
БС-2.29	45×145	2458	стык панелей x = 2.507
БС-2.30	45×145	924	стык фронтонных деталей x = 2.507
БС-2.31	45×145	1035	стык фронтонных деталей x = 2.813
БС-2.32	45×145	1036	стык фронтонных деталей x = 4.348
БС-2.33	45×145	791	стык фронтонных деталей x = 5.020
БС-2.34	45×145	201	стык фронтонных деталей x = 6.640
БС-2.35	45×145	2690	горизонтальный стык фронтона на отм. 2,500
БС-2.36	45×145	1500	горизонтальный стык фронтона на отм. 2,500
БС-2.37	45×145	2692	горизонтальный стык фронтона на отм. 2,500
БС-3.09	20×145	6000	лежень (низ стены)
БС-3.10	20×145	1172	лежень (низ стены)
БС-3.11	20×145	3763	верх фронтона по скату (левый)
БС-3.12	20×145	3763	верх фронтона по скату (правый)
СТП-2.01	95×145	3309	откос ДП-02 и шов фронтона до низа прогона ПР-1 (3,354; 15.10 — было до 2,665)
СТП-2.02	95×145	3309	откос ДП-02 и шов фронтона до низа прогона ПР-1 (3,354; 15.10 — было до 2,665)


Итого по стене

- БС-1 — рамка проёма / угловая доска 45×145 (паз 40, выступ 5): 4 шт, 8,22 м
- БС-2 — доска в стыке панелей 45×145: 15 шт, 24,21 м
- БС-3 — лежень / верх стены 20×145: 4 шт, 14,70 м
- СТП-2 — стойка 95×145 под прогон: 2 шт, 6,62 м

Марки досок — как в раскрое пиломатериала (листы ПМ, карты досок 6 м).
Марки панелей (серым) — как в карте раскроя СИП.
Длины — по проекту, перед резом сверить по месту.

Ключ-план (стена — красным)

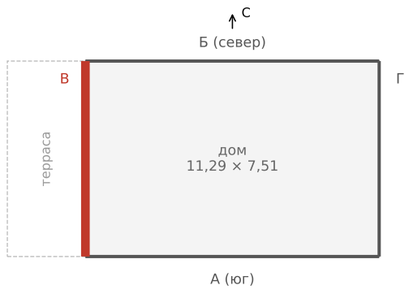

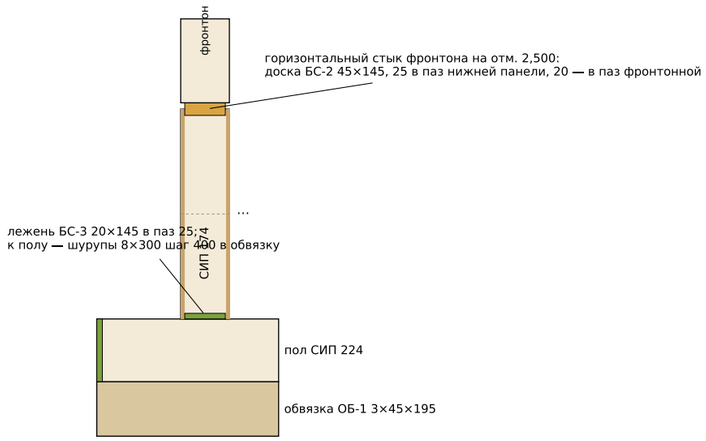

Разрез по стене (схема, без масштаба по высоте)

Дом 45 · «Дублин» (ГП1) · листы стен для бригады	Лист
Стена В (запад, к террасе): каркас, панели, доски с марками	СТ-3

Стена Г (восток, вход) — каркас из досок и раскладка панелей СИП 174 (вид снаружи с востока (от крыльца))




Марка	Сечение	L, мм	Что это
БС-1.15	45×145	900	верх проёма ДП-01
БС-1.16	45×145	2523	угловая доска 45×145 (40 в паз 40 торца, выступ 5 до проходящей стены)
БС-1.17	45×145	2523	угловая доска 45×145 (40 в паз 40 торца, выступ 5 до проходящей стены)
БС-2.38	45×145	2458	стык панелей x = 3.106 = стойка проёма ДП-01, на всю высоту
БС-2.39	45×145	2458	стык панелей x = 4.041 = стойка проёма ДП-01, на всю высоту
БС-2.40	45×145	2458	стык панелей x = 1.252
БС-2.41	45×145	467	стык фронтонных деталей x = 1.252
БС-2.42	45×145	2458	стык панелей x = 2.507
БС-2.43	45×145	924	стык фронтонных деталей x = 2.507
БС-2.44	45×145	1142	стык фронтонных деталей x = 3.106
БС-2.45	45×145	1147	стык фронтонных деталей x = 4.041
БС-2.46	45×145	2458	стык панелей x = 5.017
БС-2.47	45×145	792	стык фронтонных деталей x = 5.017
БС-2.48	45×145	2458	стык панелей x = 6.272
БС-2.49	45×145	335	стык фронтонных деталей x = 6.272
БС-2.50	45×145	4972	горизонтальный стык фронтона на отм. 2,500
БС-2.51	45×145	2100	горизонтальный стык фронтона на отм. 2,500
БС-3.13	20×145	6000	лежень (низ стены)
БС-3.14	20×145	1172	лежень (низ стены)
БС-3.15	20×145	3763	верх фронтона по скату (левый)
БС-3.16	20×145	3763	верх фронтона по скату (правый)


Итого по стене

- БС-1 — рамка проёма / угловая доска 45×145 (паз 40, выступ 5): 3 шт, 5,95 м
- БС-2 — доска в стыке панелей 45×145: 14 шт, 26,63 м
- БС-3 — лежень / верх стены 20×145: 4 шт, 14,70 м

Марки досок — как в раскрое пиломатериала (листы ПМ, карты досок 6 м).
Марки панелей (серым) — как в карте раскроя СИП.
Длины — по проекту, перед резом сверить по месту.

Ключ-план (стена — красным)

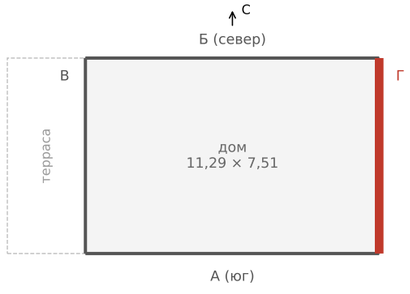

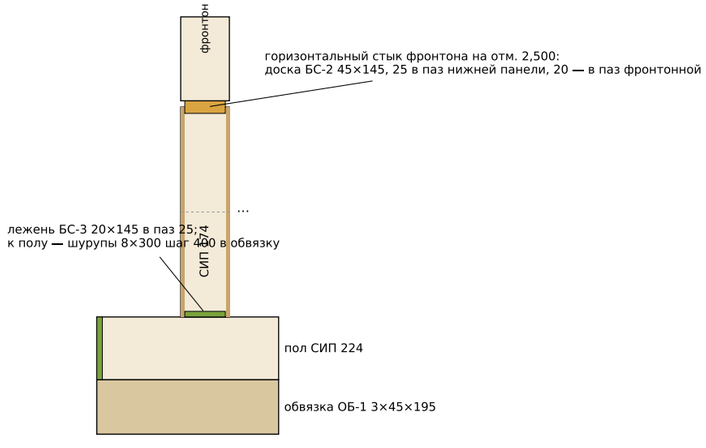

Разрез по стене (схема, без масштаба по высоте)

Дом 45 · «Дублин» (ГП1) · листы стен для бригады	Лист
Стена Г (восток, вход): каркас, панели, доски с марками	СТ-4
