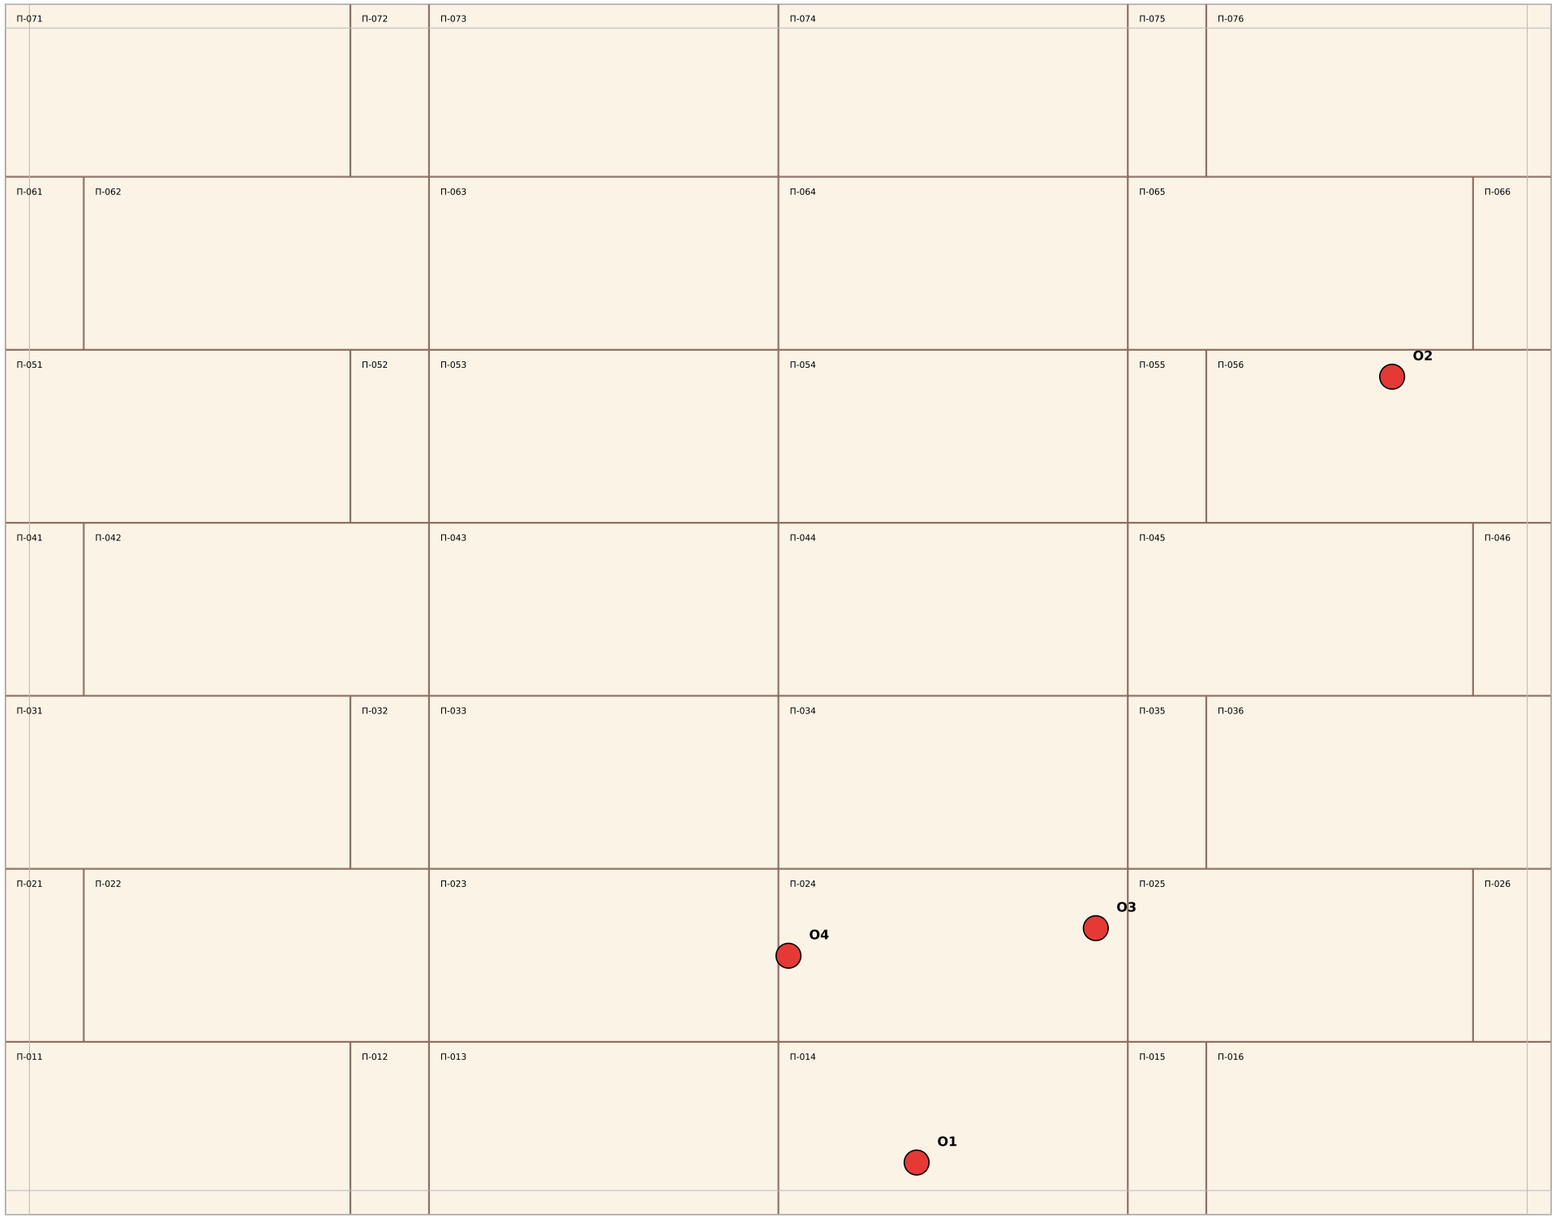


№	что	панель	x	y	Ø	примечание
O1	В1 ввод	П-014	33,000	-0,050	Ø60	ввод воды ПНД 32 — отв. Ø60, без гильзы (скважинщики)
O2	Ст К1-1	П-056	36,450	5,650	Ø130	стояк К1 Ø110 — отв. Ø130, зазор — пена, без гильзы
O3	Ст К1-2	П-024	34,300	1,650	Ø130	стояк К1 Ø110 — отв. Ø130, зазор — пена, без гильзы
O4	ЭЛ ввод	П-024	32,070	1,450	Ø60	ввод ВБбШв 3×16 в стальной гильзе — снизу в стенку оси 3 под щит (отв. Ø60)

Отверстия сверлить корончатым сверлом по месту после раскладки; края обработать, зазор — монтажная пе
Кабели к точкам — в каркасе стен (ЭЛ), трубы В1/Т3 — открыто на клипсах (ВК); других отверстий в пол нет.

Дом 45 · проект «Прага» (ГПЗ) · одноэтажный дом из СИП-панелей 11,215 × 8,78, крыльцо и терраса

КР — конструктивные решения · модель ArchiCAD Praha_d45 (КР внесён 23.10), geom.py, kr/calc_praha.py, раскрой СИП и ПМ

Карта отверстий в панелях пола СИП 224 (стояки К1, ввод воды, ввод электрики)

Стадия: П

Лист: КР-15

Разработал: агент-архитектор Дом 45 · 23.10.2026 · по образцу КР «Лион» / «Осло» · пол СИП без лаг

Утвердил: _____ (Дом 45)
