«Гамильтон» — карта раскроя СИП-панелей (v3.1: наборные проёмы, паз 25, шаг 1255) · 22.10.20

Заготовка	Кол-во	м²	в деталях	отход
СИП 174×1250×2800	44	154.0	141.62	8.0 %
СИП 224×1250×2500	11	34.38	26.79	22.1 %
СИП 224×1250×2800	27	94.5	91.16	3.5 %
ИТОГО	82	282.88	259.57	8.2 %

Детали: С1-… / С2-… стены 1 / 2 этажа (развёртки ниже; буква — стена: В север, 1 запад, 4 восток, БЗ/БВ стены Б у крыльца/террасы, ЭА фронт эркера, Э2/Э3 бока эркера),

П-… пол 1 этажа (полосы А…Е с юга, колонки 1…4 с запада), Ч-… чердачное перекрытие (так же).

Размеры деталей в карте — чистые (без шва). При монтаже между панелями шов 5 мм на монтажной пене: модуль раскладки 1255 = панель 1250 + шов 5 — он уже учтён в раскладке и в размерах стен на листах КР.

Все кромки всех панелей — стандартный заводской паз 25 мм. Исключение: у примыкающих стен (В, Б, бока эркера у фронта) боковая кромка у угла — паз 40 мм.

Проёмы наборные: детали под и над проёмом — отдельные прямоугольники, боковые панели целые или обрезаны по краю проёма (проём + 20 мм на сторону). Размеры на чертежах — окончательные.

Стены обоих этажей — высота 2800 (заготовка 1250×2800 без обрезки по высоте). Пол 1 этажа и чердачное перекрытие — СИП 224, панели длиной вдоль дома (по x).


Если из одной заготовки выходит несколько деталей, между ними заложено 4 мм на ширину пилы (пропил). Комплектация — только панели.

Межэтажное перекрытие (балки 2,800…2,995) и кровля — деревянные, в раскрой СИП не входят (раскрой пиломатериала ПМ).

Что отличается от модели и почему — страница изменений проекта (izmeneniya.html) и вкладка «Расхождения с моделью» в Excel.


Стена В (север), 1 этаж (вид снаружи с севера, восток слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С1-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «добор в конце»

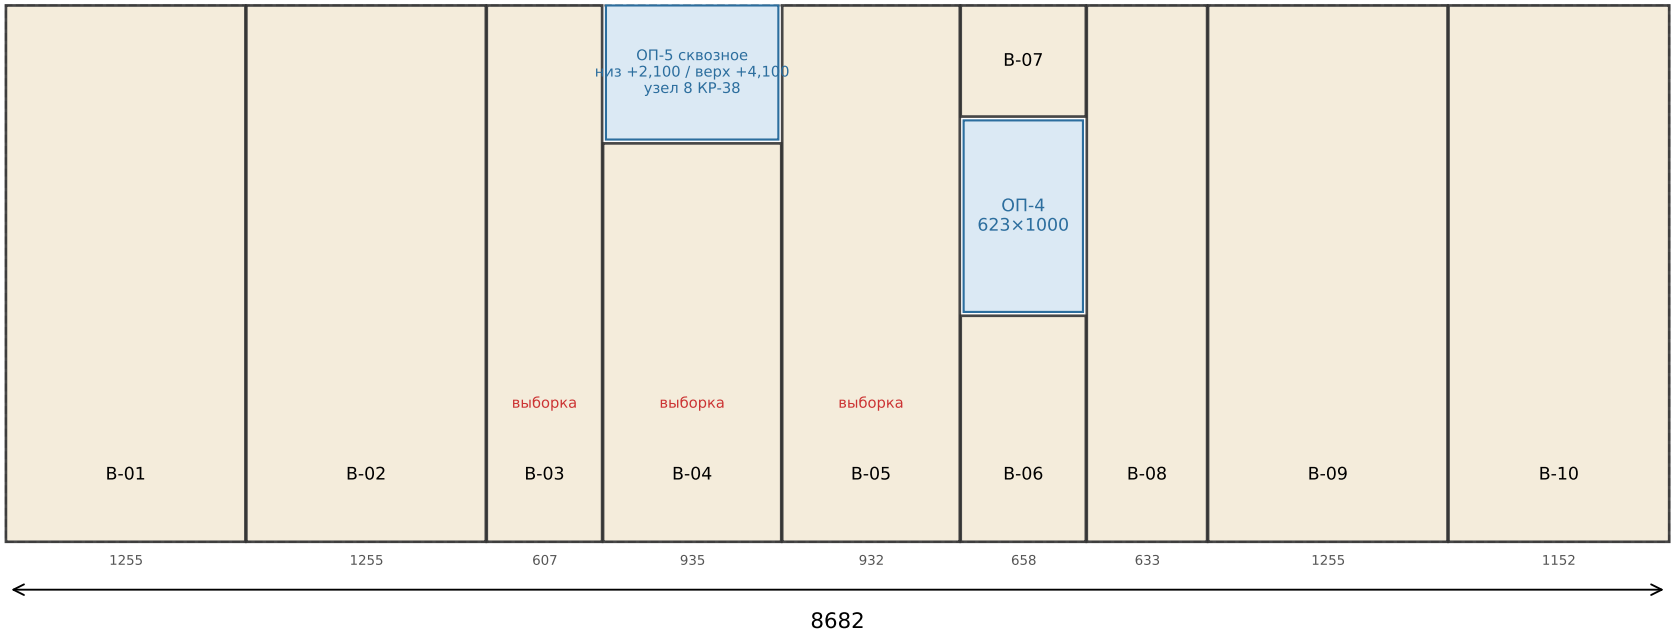


Стена 1 (запад), 1 этаж (вид снаружи с запада, север слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С1-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «по простенкам

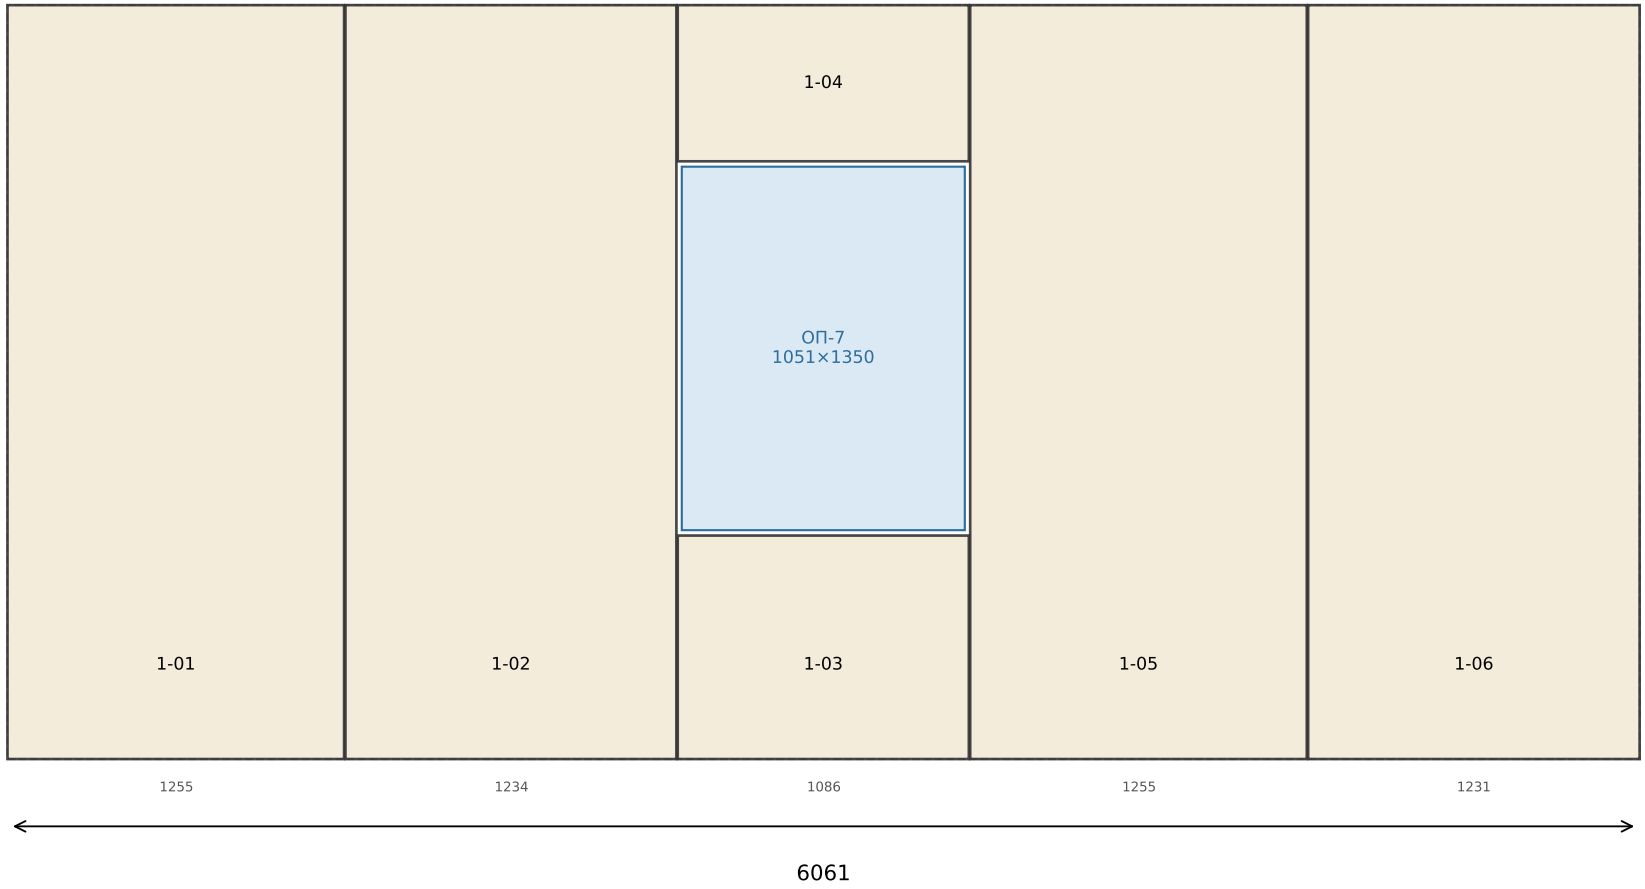


Стена 4 (восток), 1 этаж (вид снаружи с востока, юг слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С1-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «по простенкам

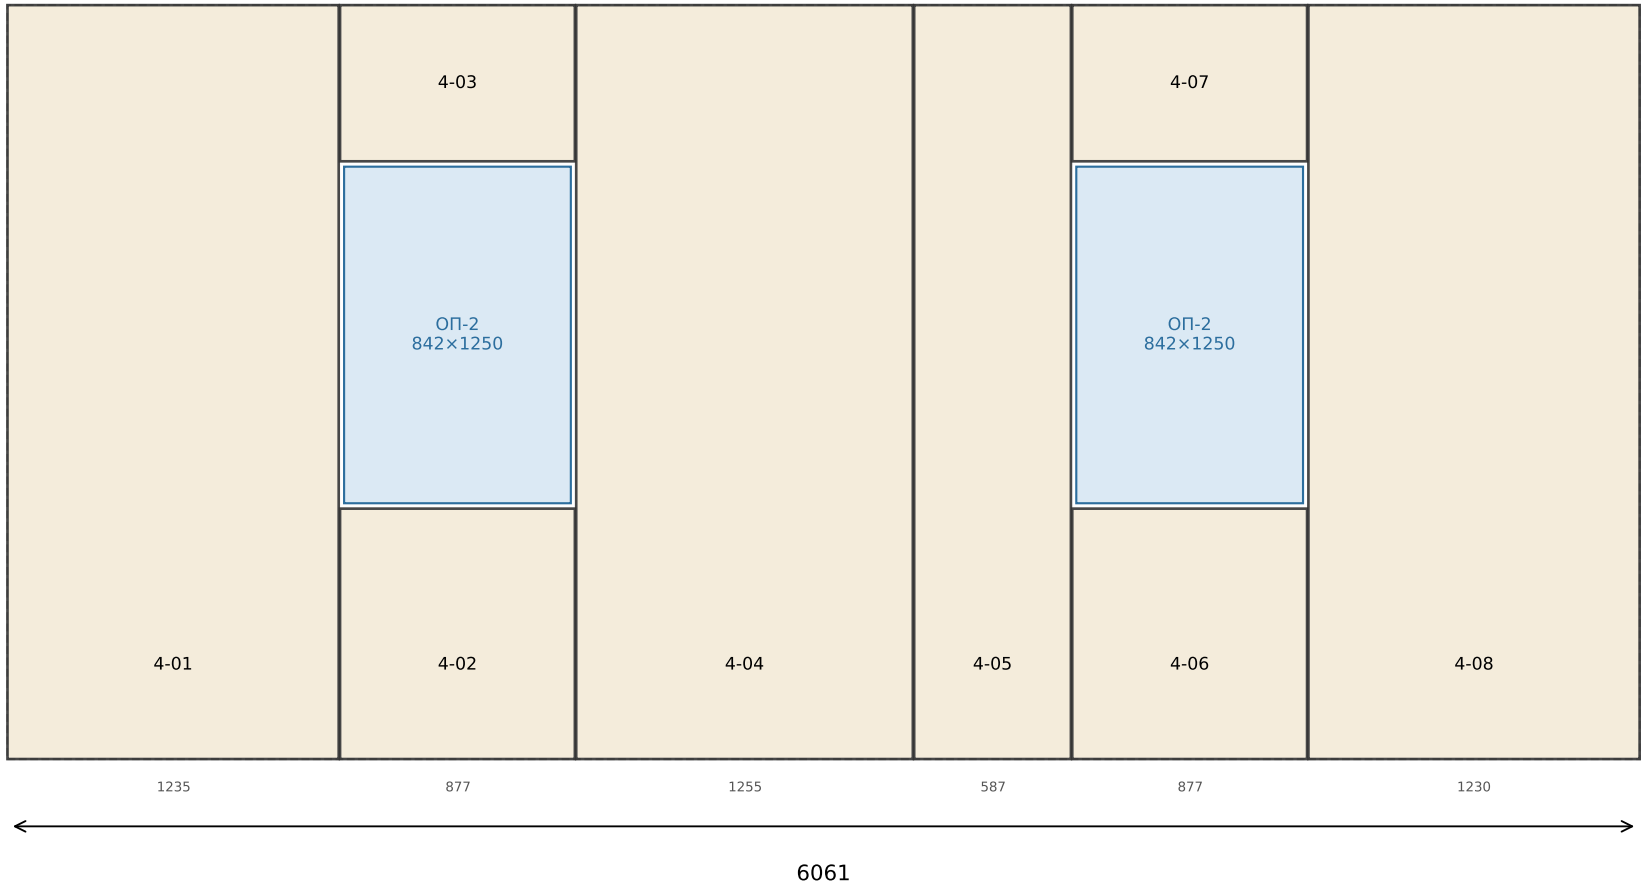


1 этаж — южная сторона: стены Б, эркер (вид снаружи; каждая стена — своя развёртка)

Стена Б (юг, крыльцо)
с юга (с крыльца), запад слева

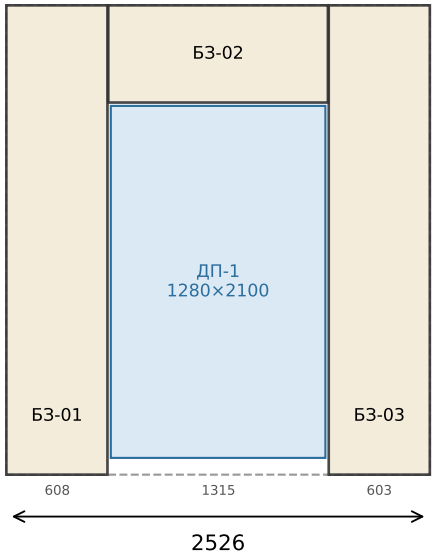


Эркер, бок 2 (запад)
с запада (с крыльца), север слева




Эркер, бок 3 (восток)
с востока (с террасы), юг слева



Стена Б (юг, терраса)
с юга (с террасы), запад слева

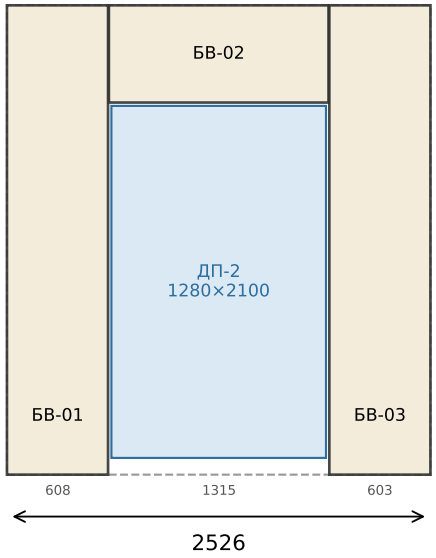


Эркер, фронт А (юг)
с юга, запад слева

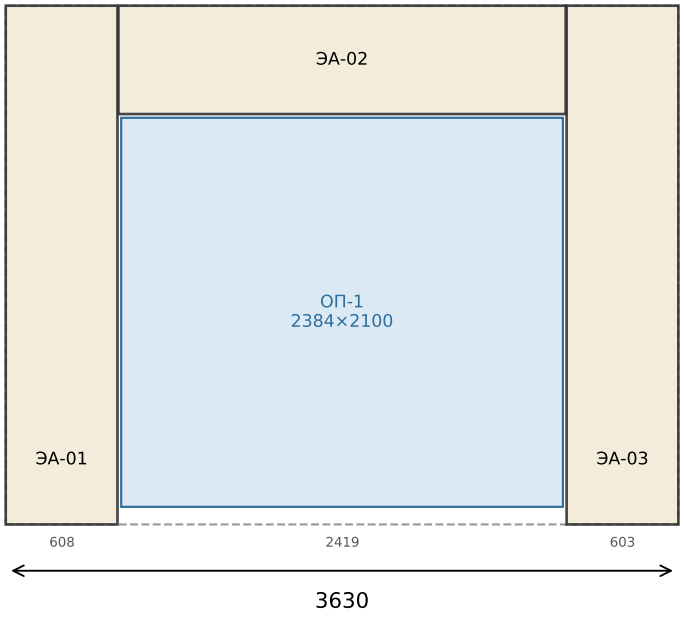


Стена В (север), 2 этаж (вид снаружи с севера, восток слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С2-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «добор в конце»

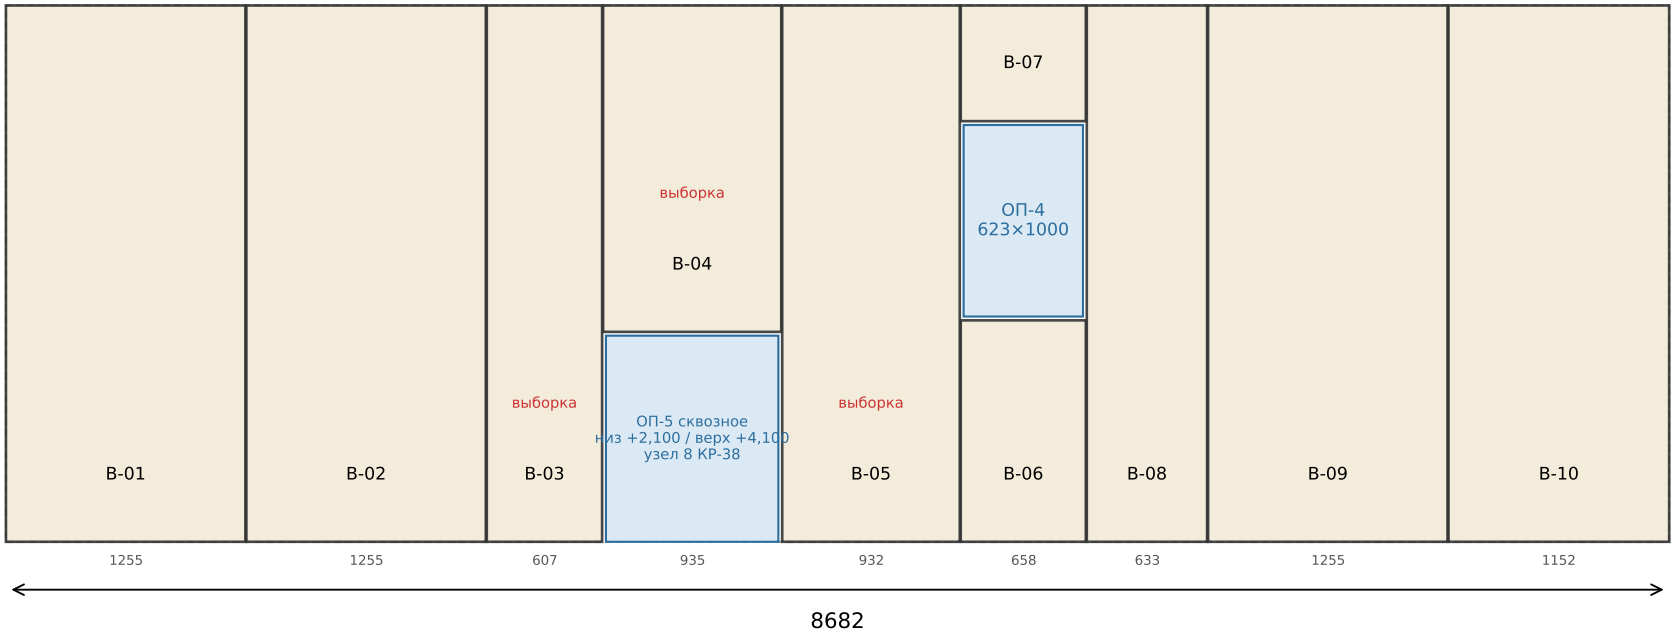


Стена 1 (запад), 2 этаж (вид снаружи с запада, север слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С2-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «по простенкам

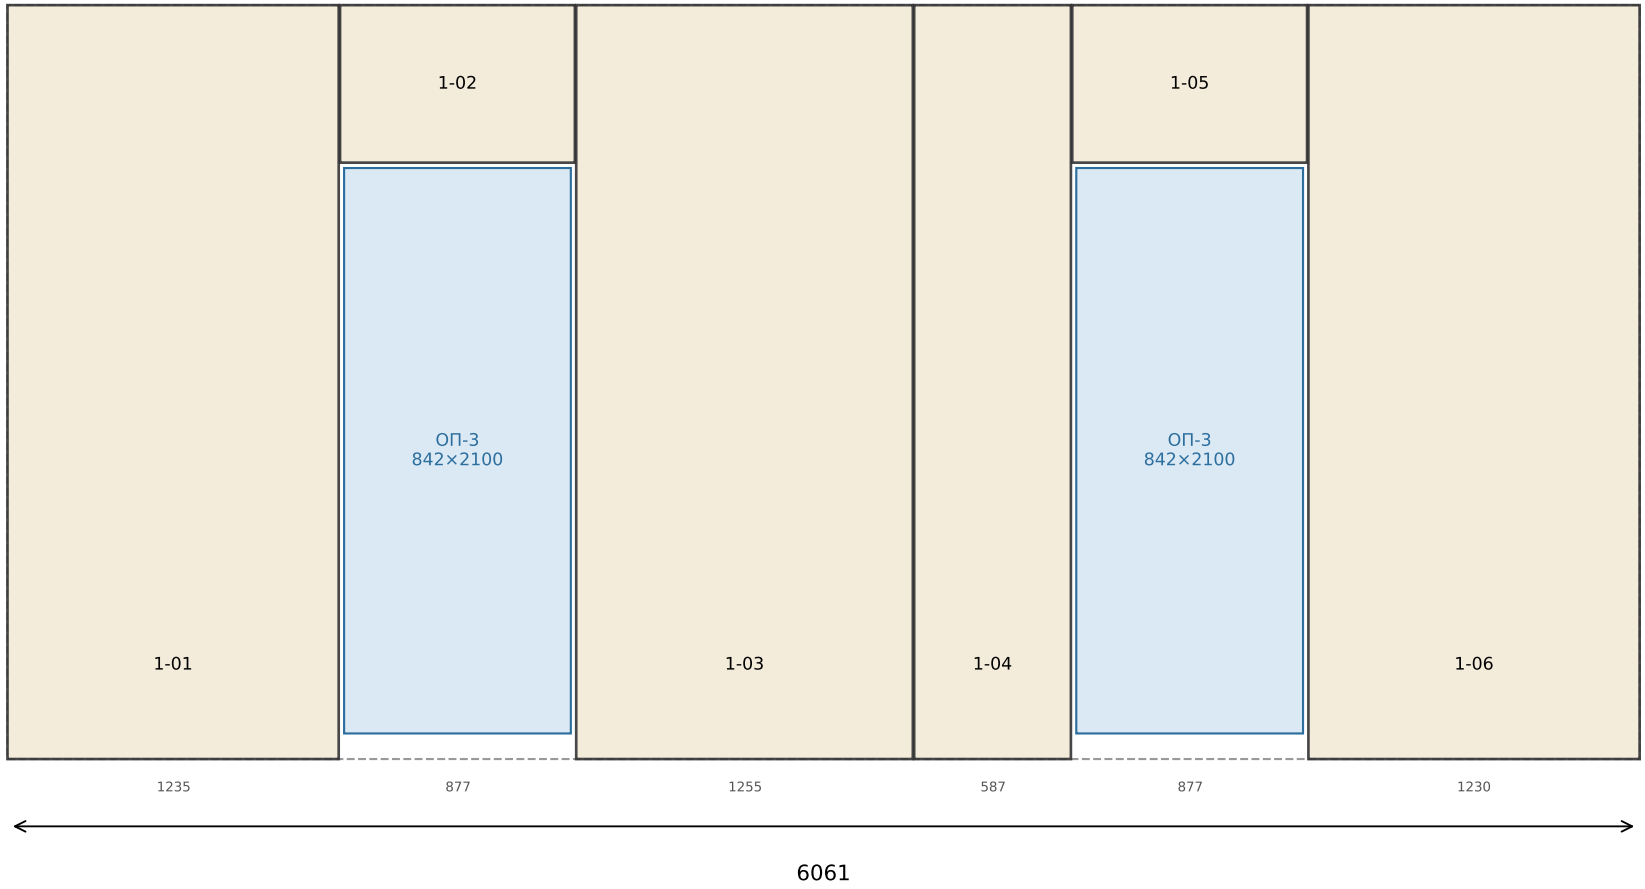


Стена 4 (восток), 2 этаж (вид снаружи с востока, юг слева)

СИП 174, h 2800; марки деталей С2-…; голубым — проёмы (наборные: детали под/над проёмом отдельные; вырез = проём + 20 мм на сторону); раскладка «по простенкам

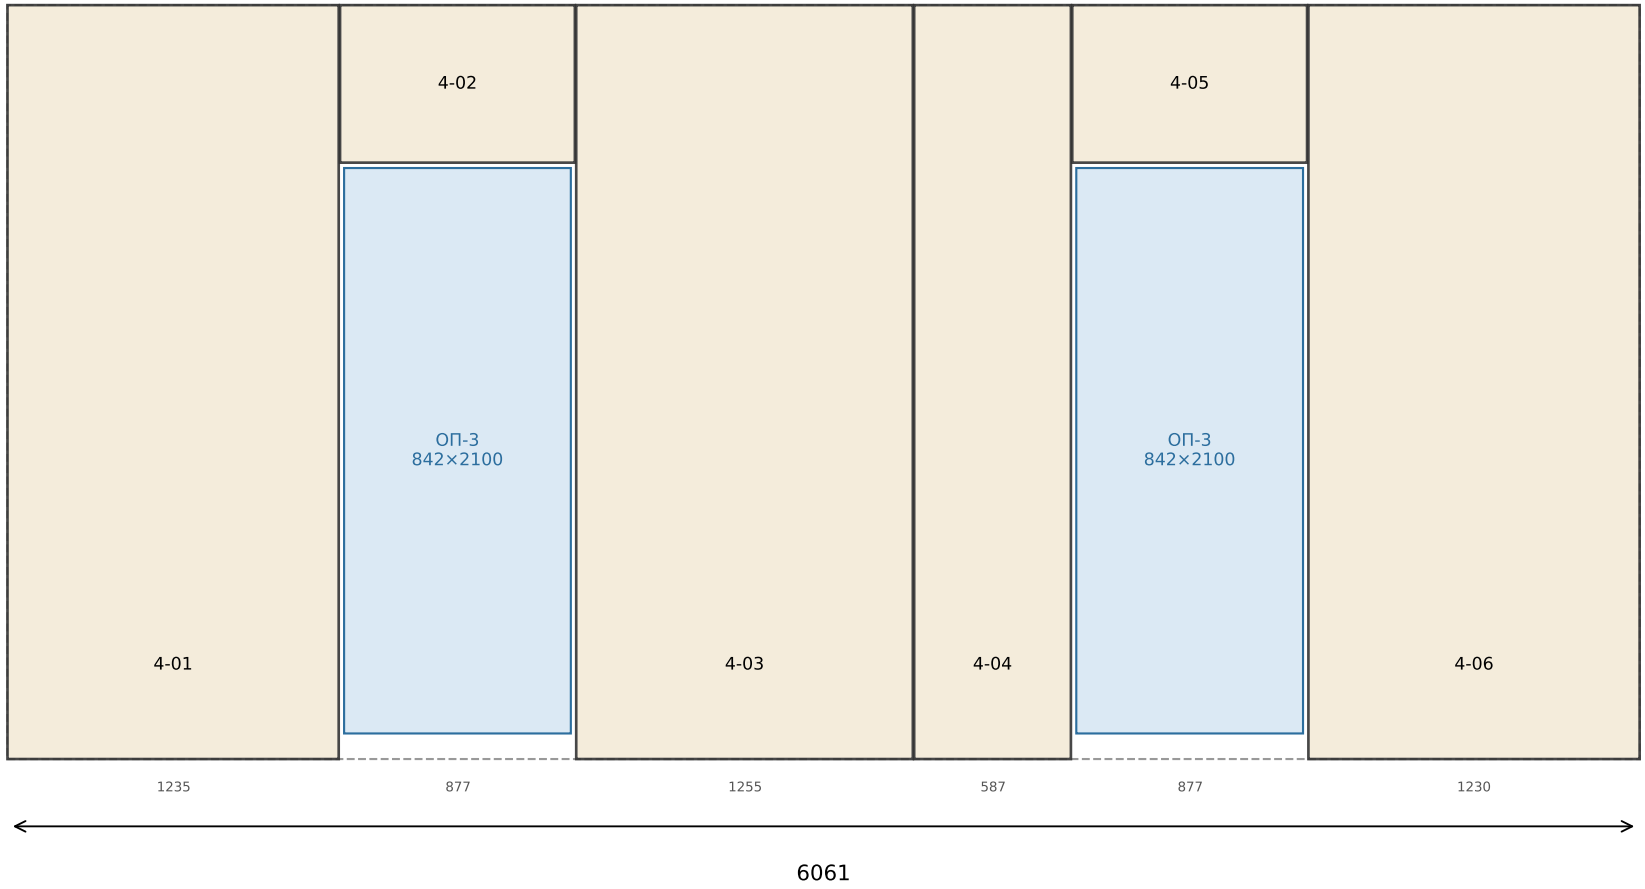


2 этаж — южная сторона: стены Б, эркер (вид снаружи; каждая стена — своя развёртка)


Стена Б (юг, крыльцо)
с юга (с крыльца), запад слева

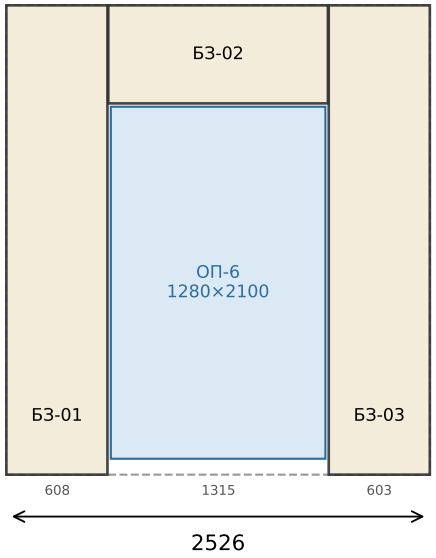


Эркер, бок 2 (запад)
с запада (с крыльца), север слева




Эркер, бок 3 (восток)
с востока (с террасы), юг слева



Стена Б (юг, терраса)
с юга (с террасы), запад слева

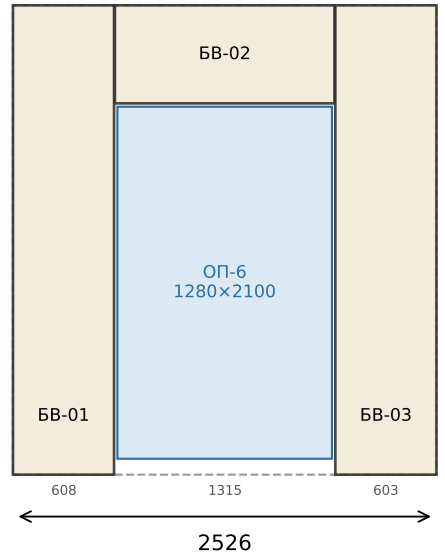


Эркер, фронт А (юг)
с юга, запад слева

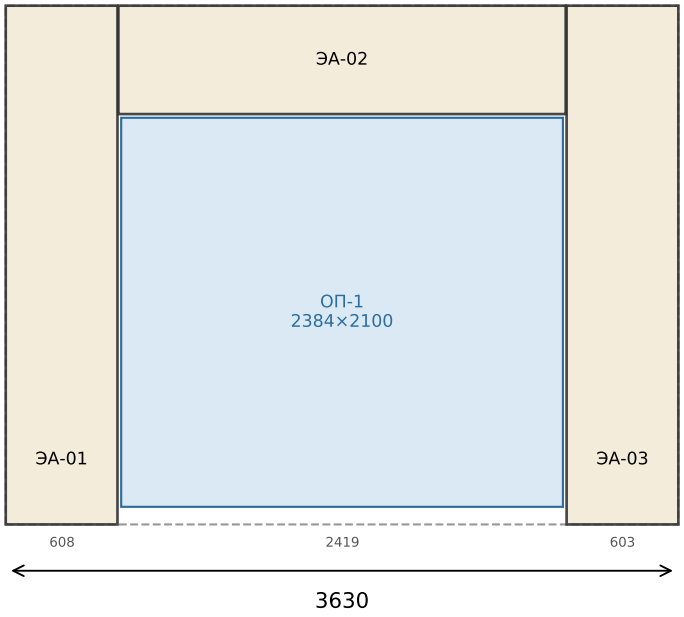

Пол 1 этажа — СИП 224, вид сверху

панели 1250 длиной вдоль x, полосы A…E с юга; север вверху

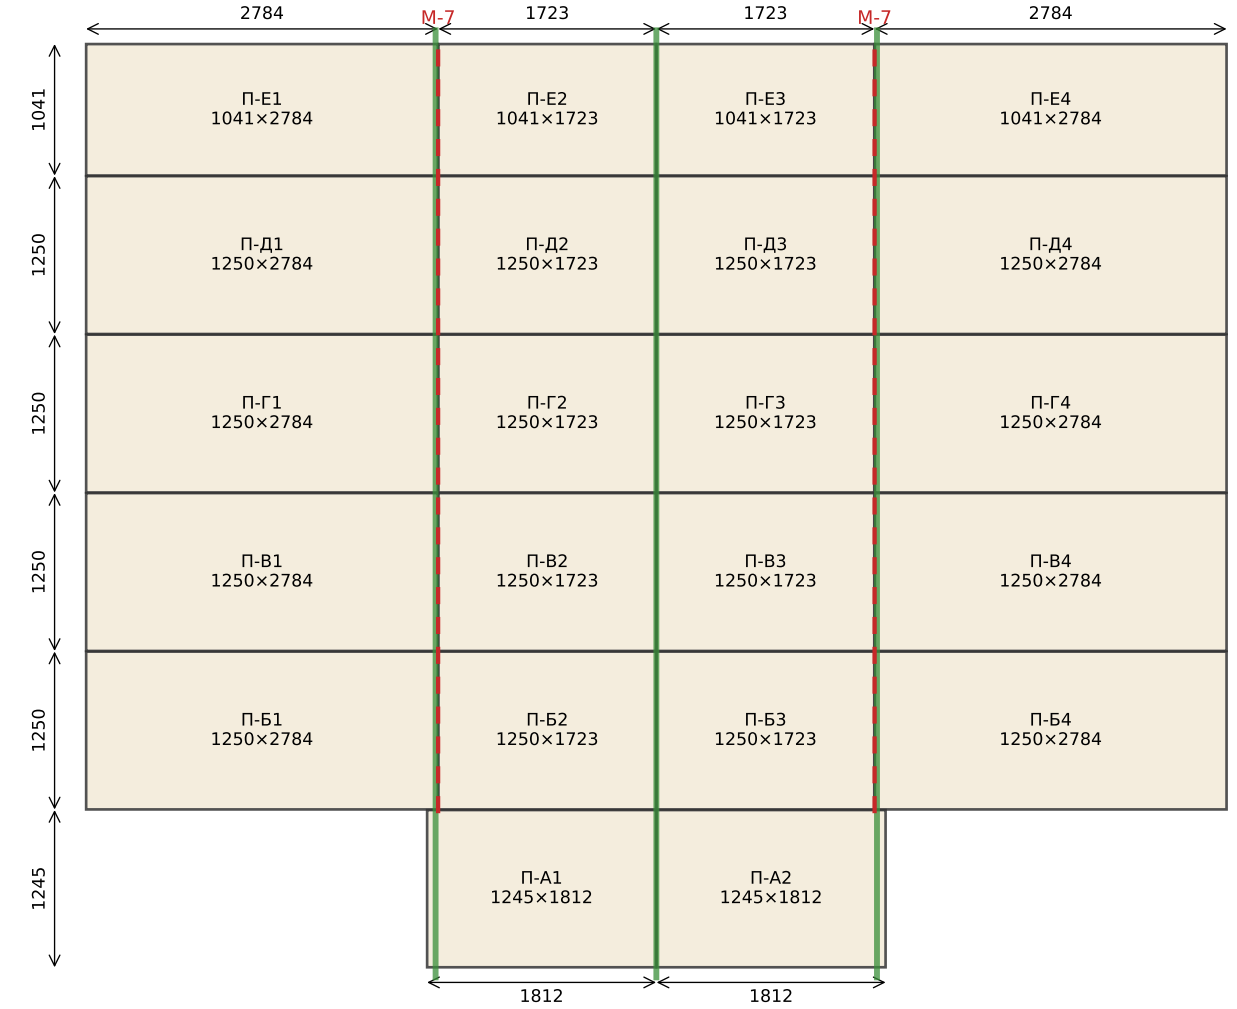

зелёная линия — ряд обвязки под полом (3×45×195 на ребро, на сваях)


шов между панелями (короткий торец) лежит на обвязке: доска 45×195 в пазу, ОСП обеих панелей на обвязке

шов М-7 под несущей стеной — вкладыш 3×45×195 (узел 2, КР-25)

Короткие швы в одну линию — вынужденно: швы под несущими стенами x 75,850 / 79,306 (М-7) — по осям стен; средний шов x 77,578 — единственный ряд обвязки между ними, а пролёт 75,850…79,306 = 3 456 мм длиннее самой длинной заготовки 2 800: разнести вразбежку с опорой на обвязку нельзя (без новых рядов обвязки и свай). Длинные швы (между полосами) — доска 45×195 в пазу 25.

Чердачное перекрытие — СИП 224, вид сверху


панели 1250 длиной вдоль x; север вверху

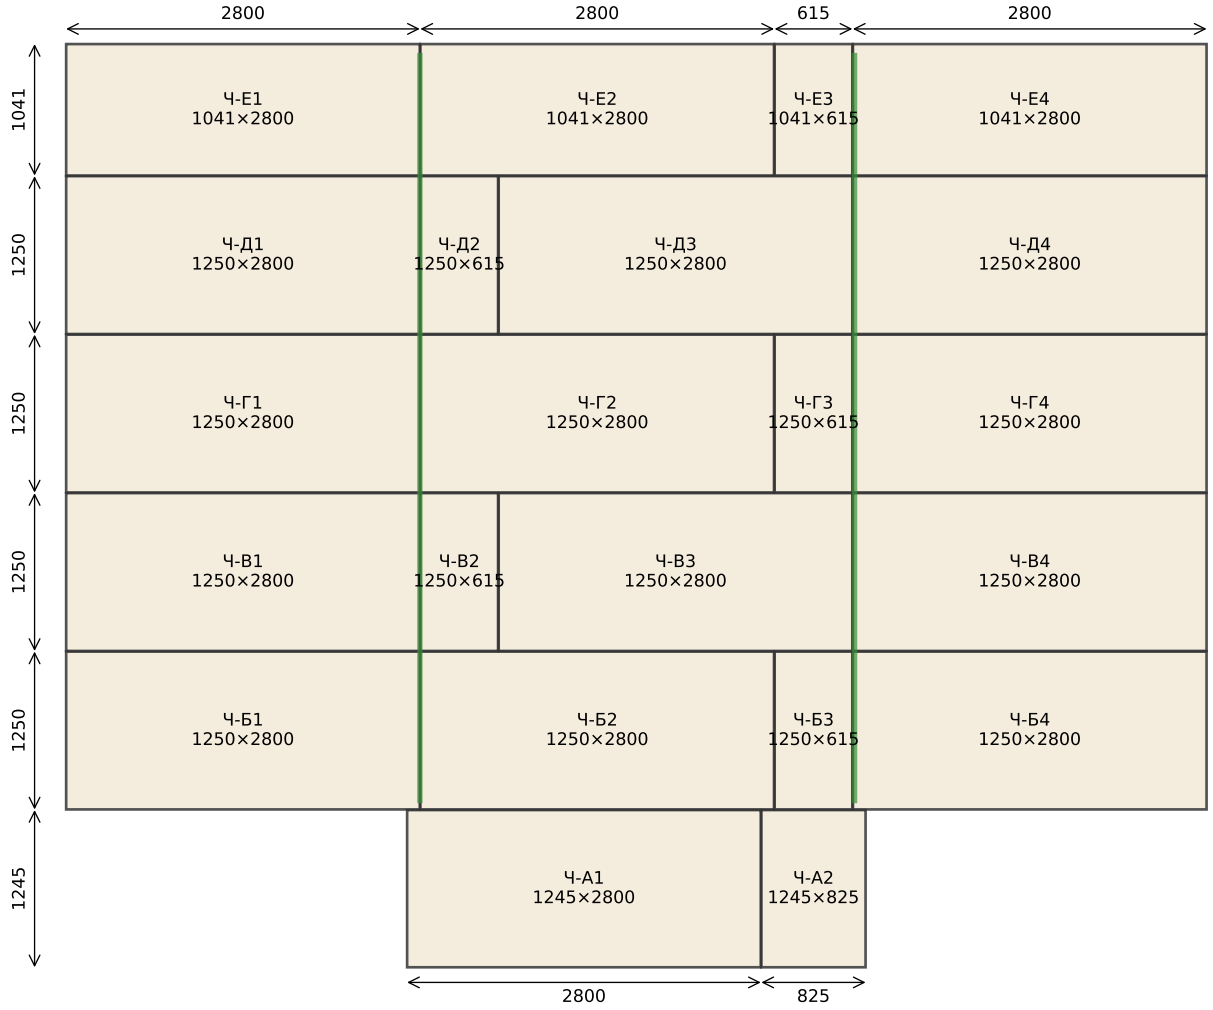


зелёная линия — несущая стена 2 эт. под перекрытием (x 75,864 / 79,306), на ней короткие швы крайних панелей

средняя зона 75,868…79,288 — короткие швы вразбежку (2800 + 615), их держат доски длинных швов 45×195


Карта раскроя заготовок

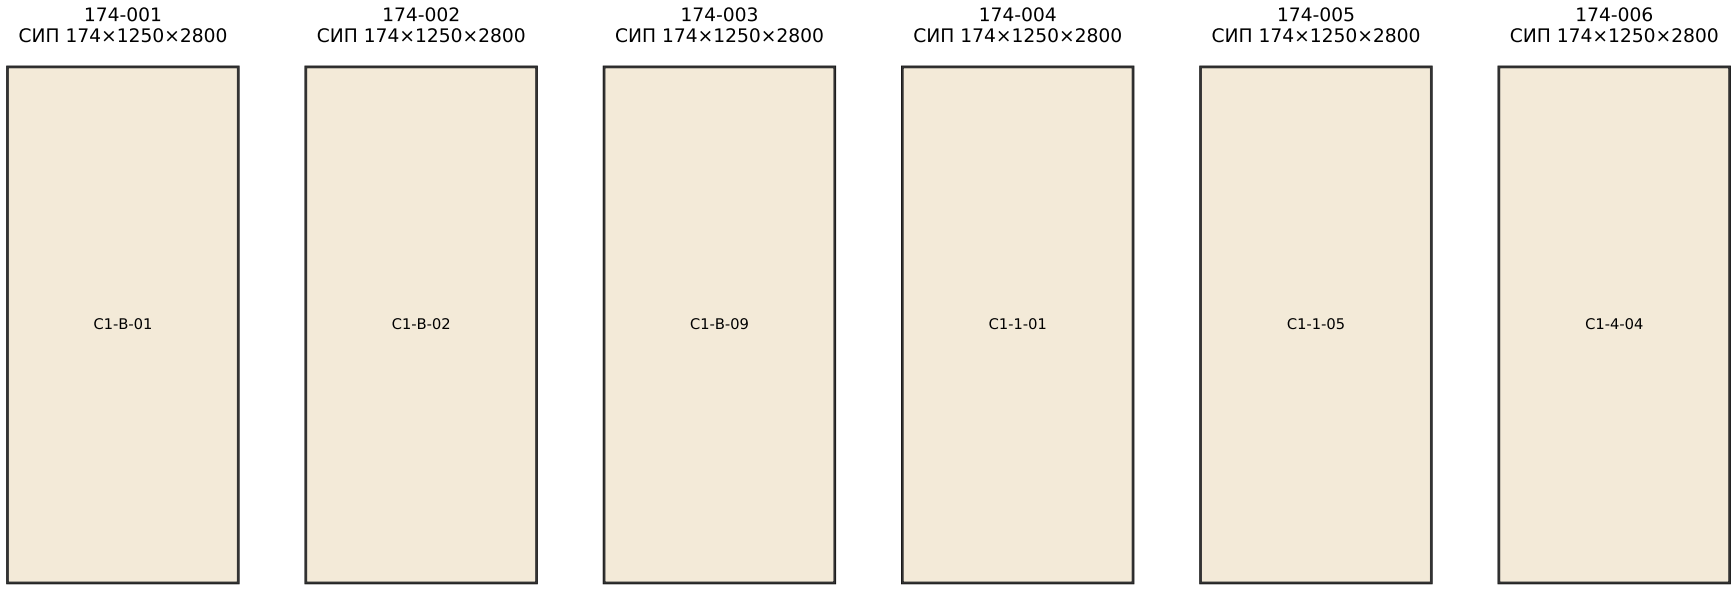


Карта раскроя заготовок

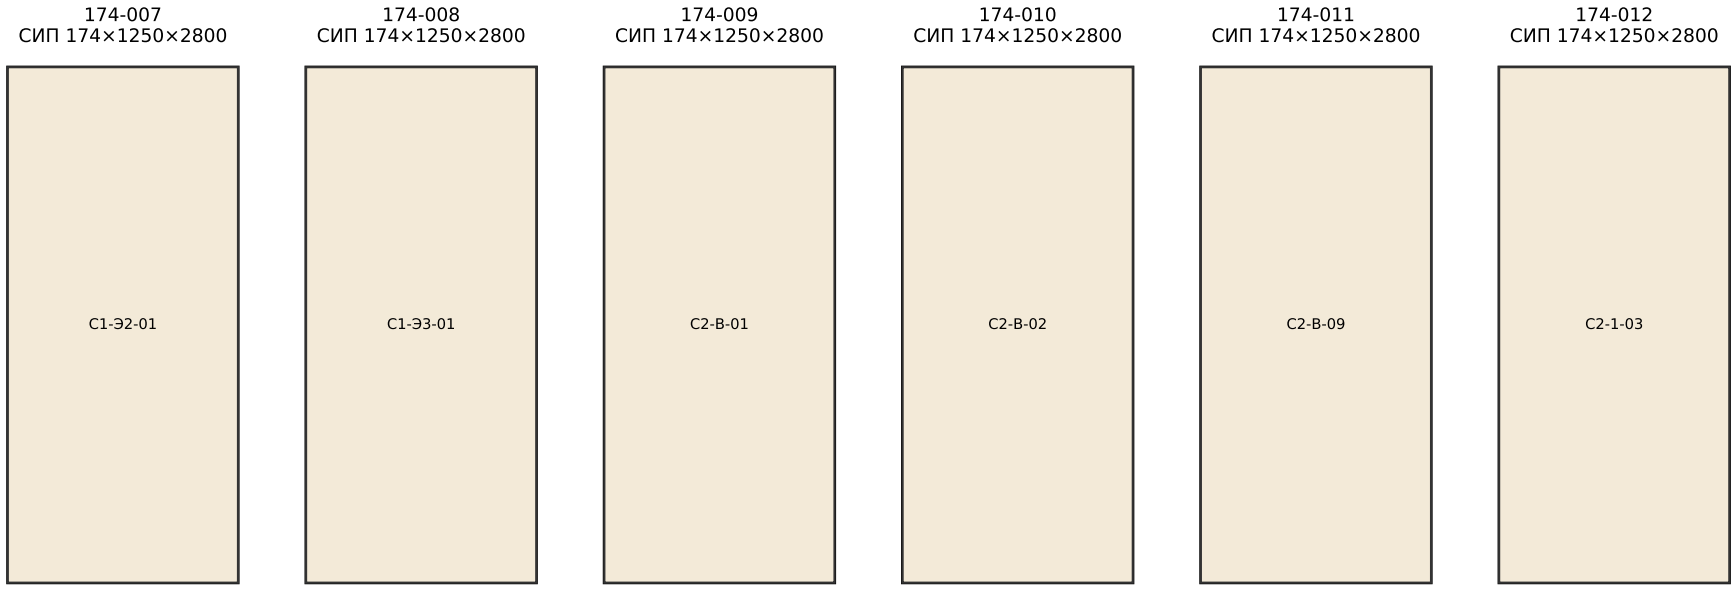


Карта раскроя заготовок

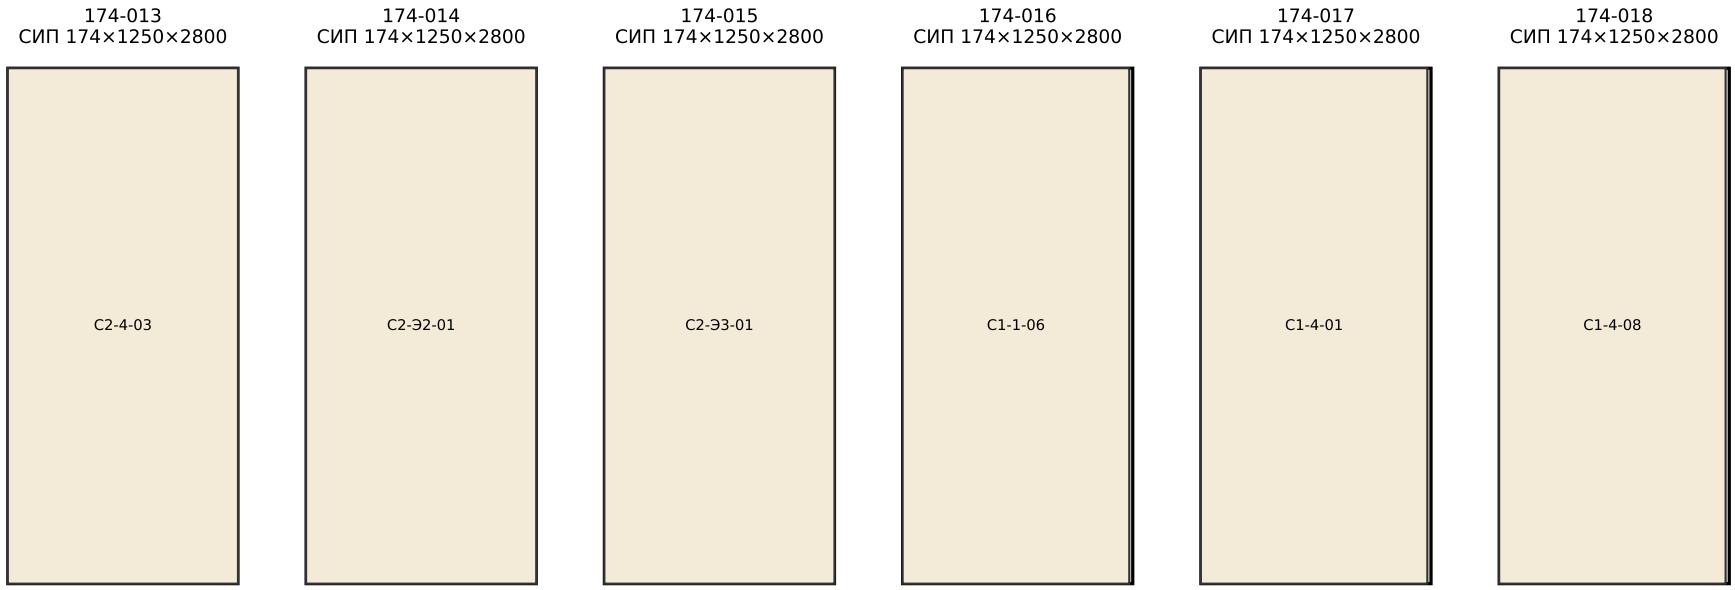


Карта раскроя заготовок

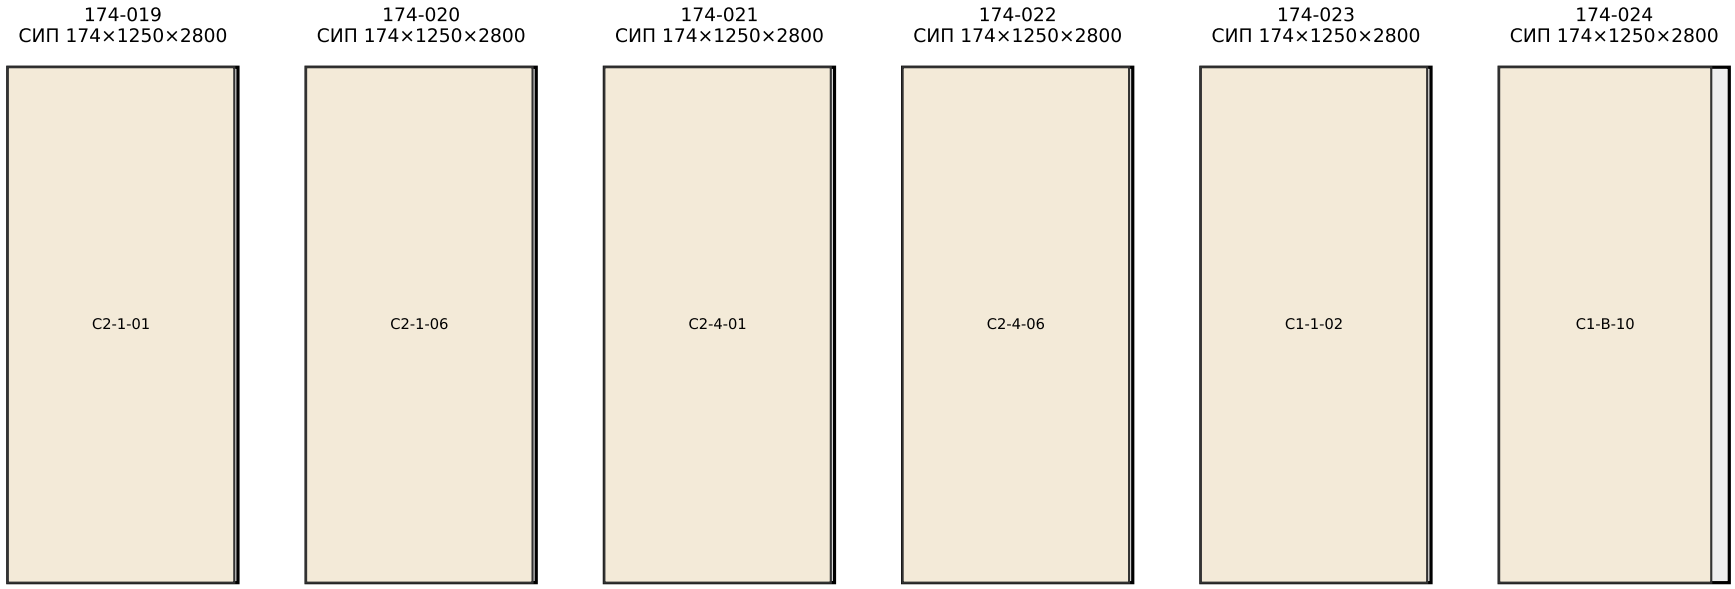


Карта раскроя заготовок

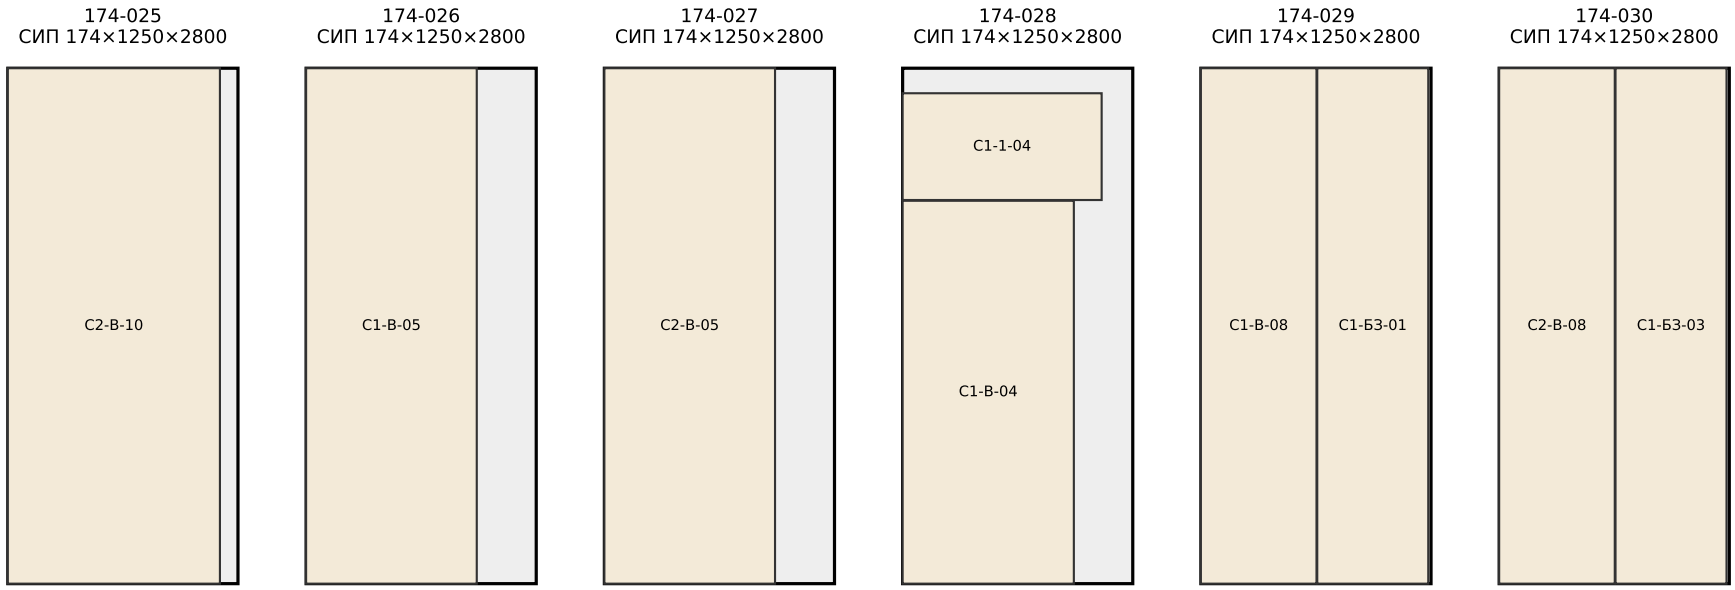


Карта раскроя заготовок

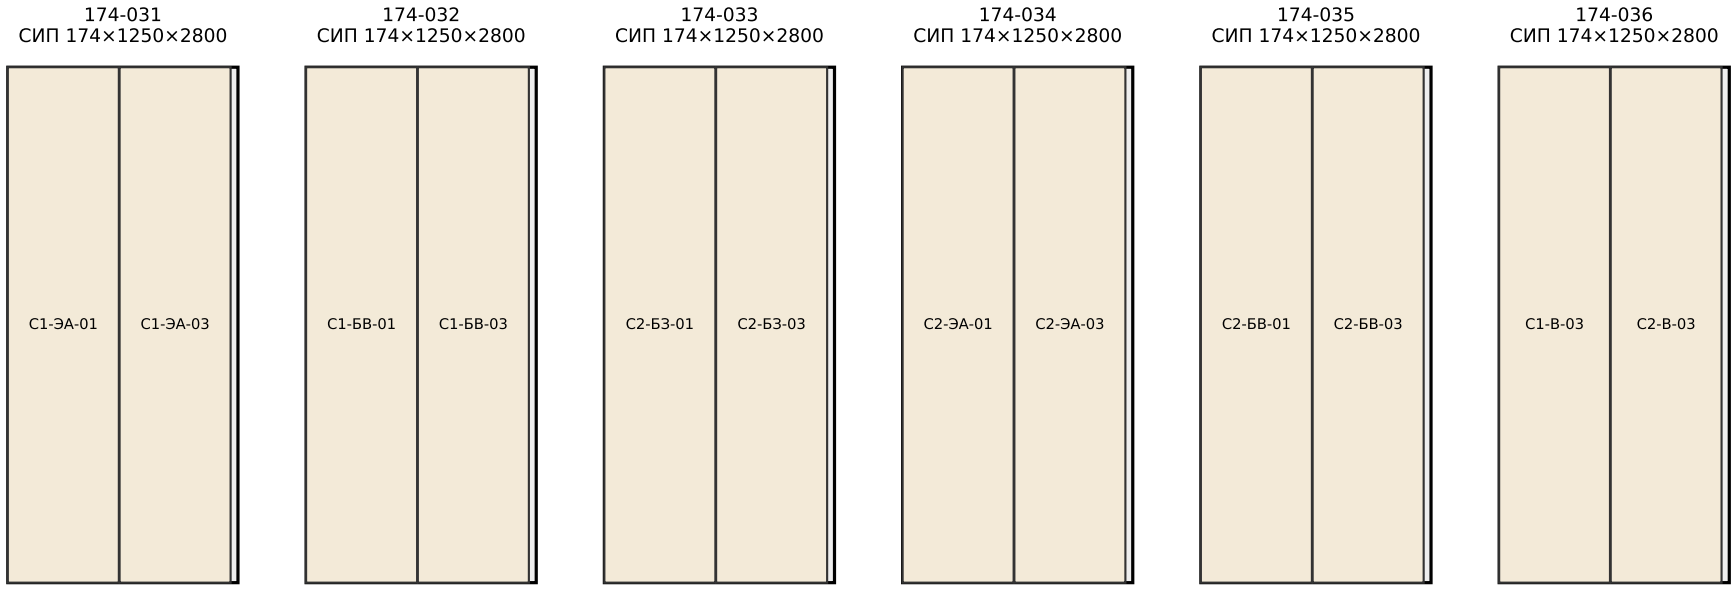


Карта раскроя заготовок

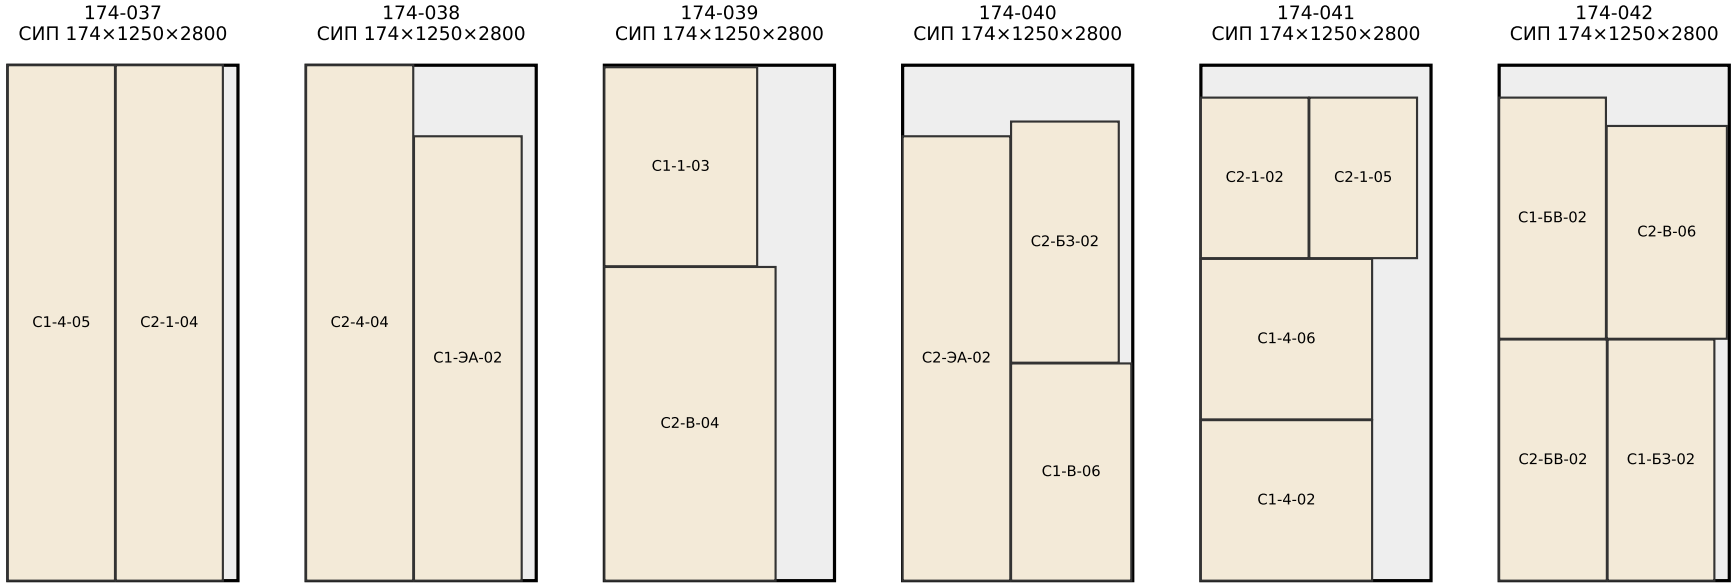


Карта раскроя заготовок

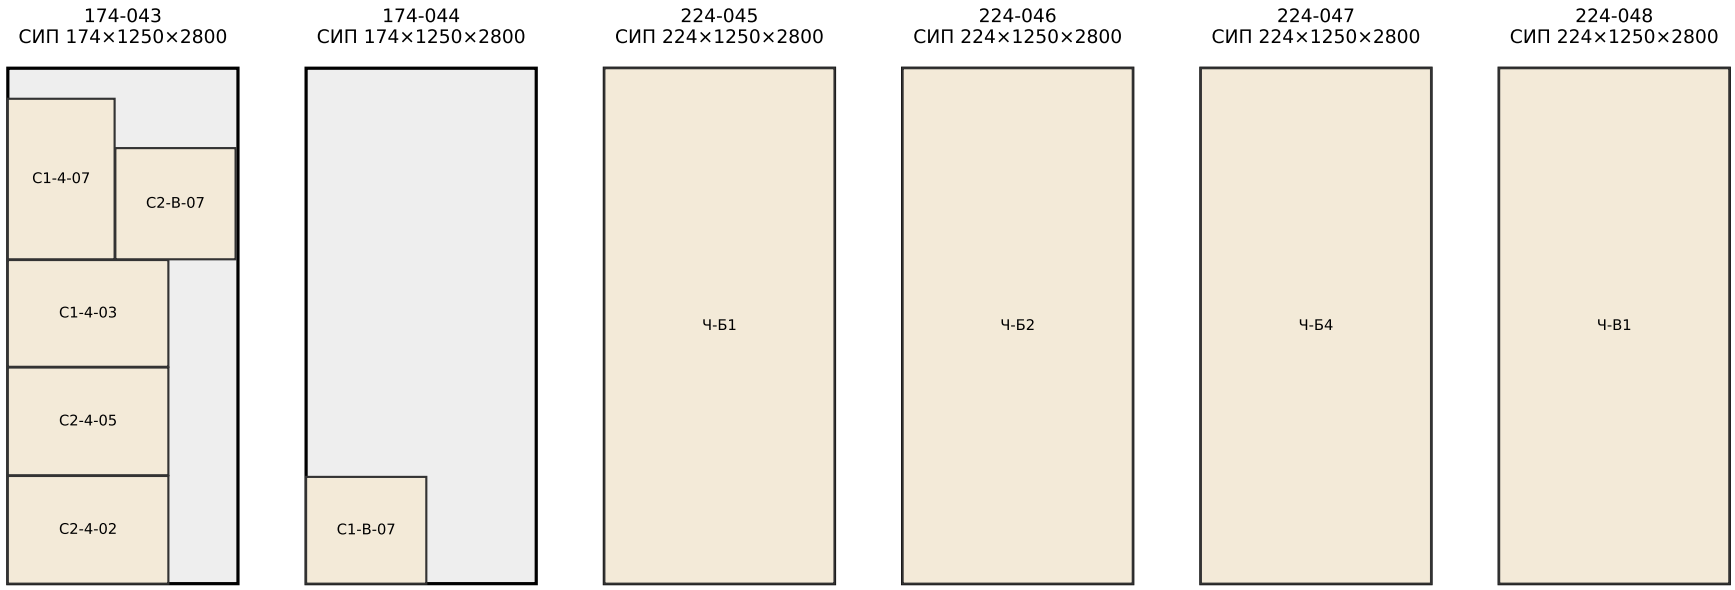


Карта раскроя заготовок

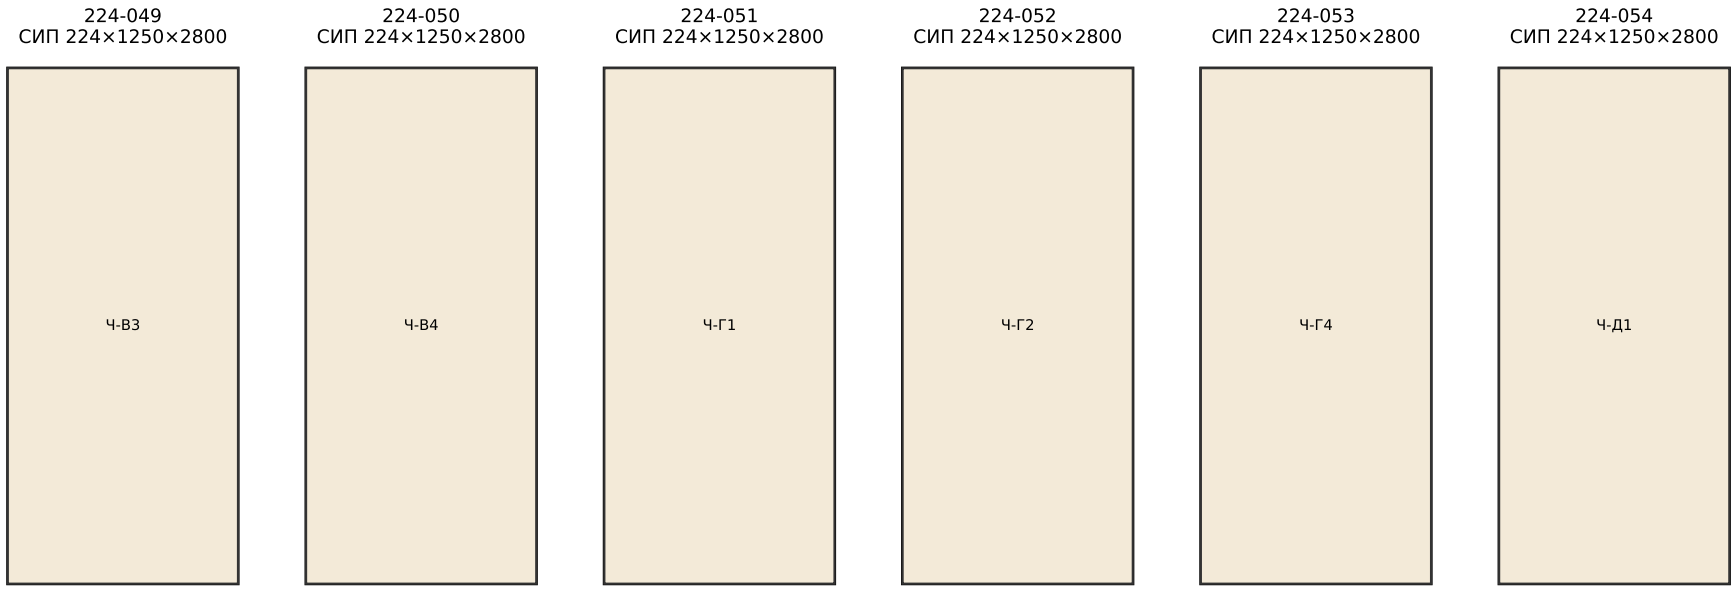


Карта раскроя заготовок

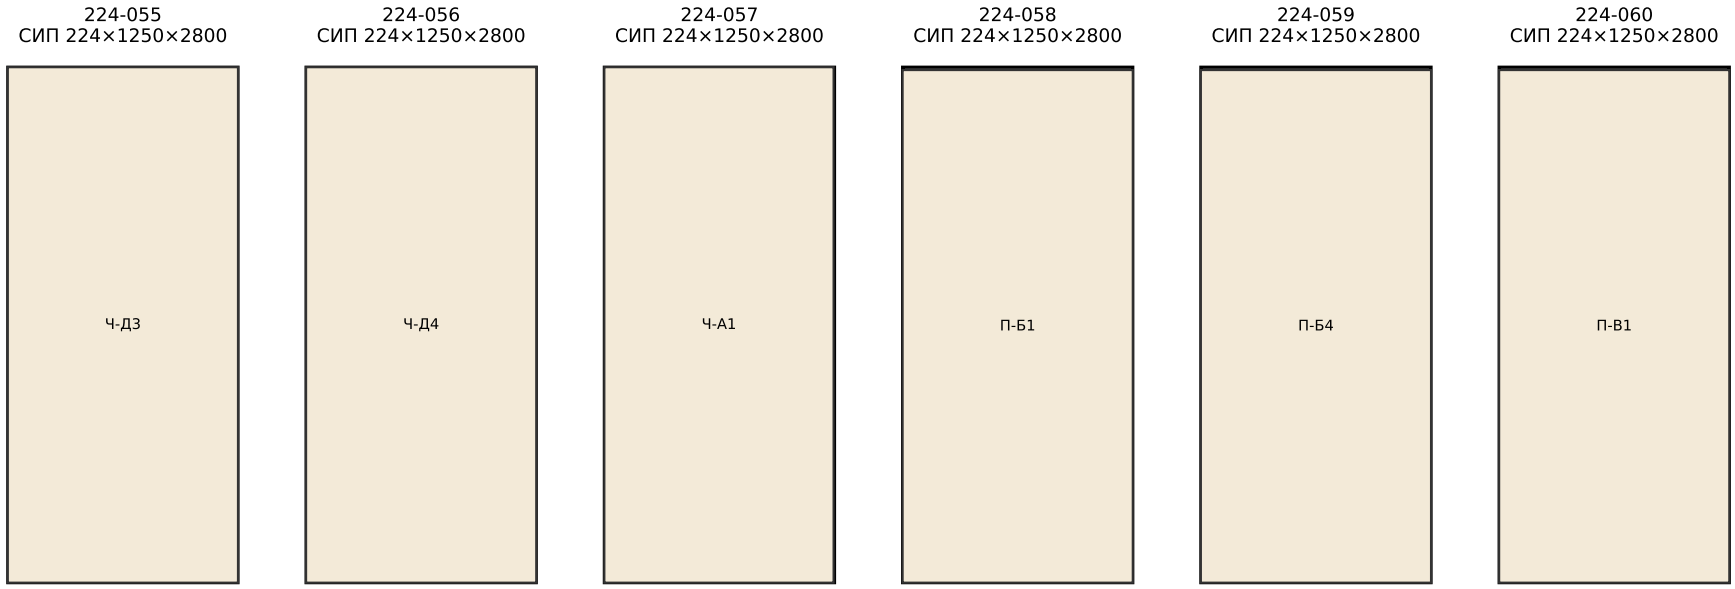


Карта раскроя заготовок

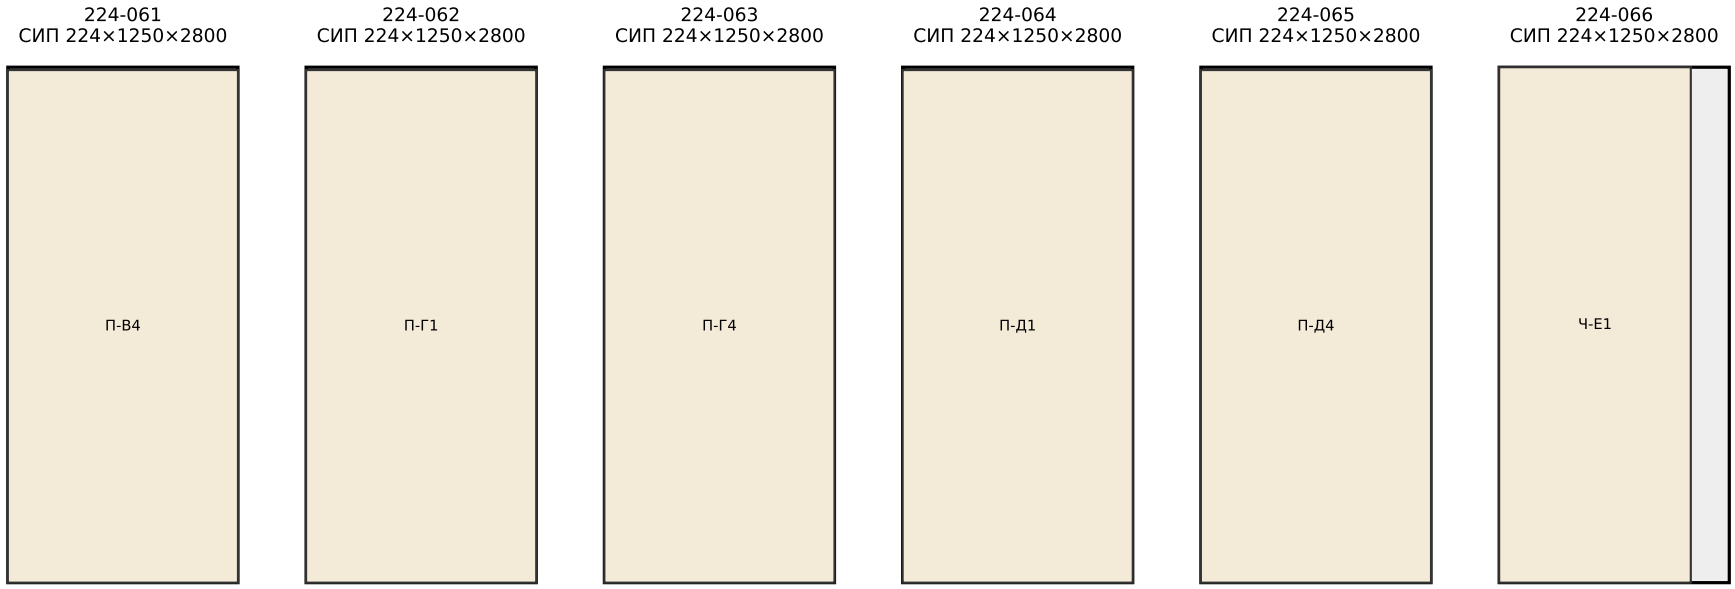

Карта раскроя заготовок

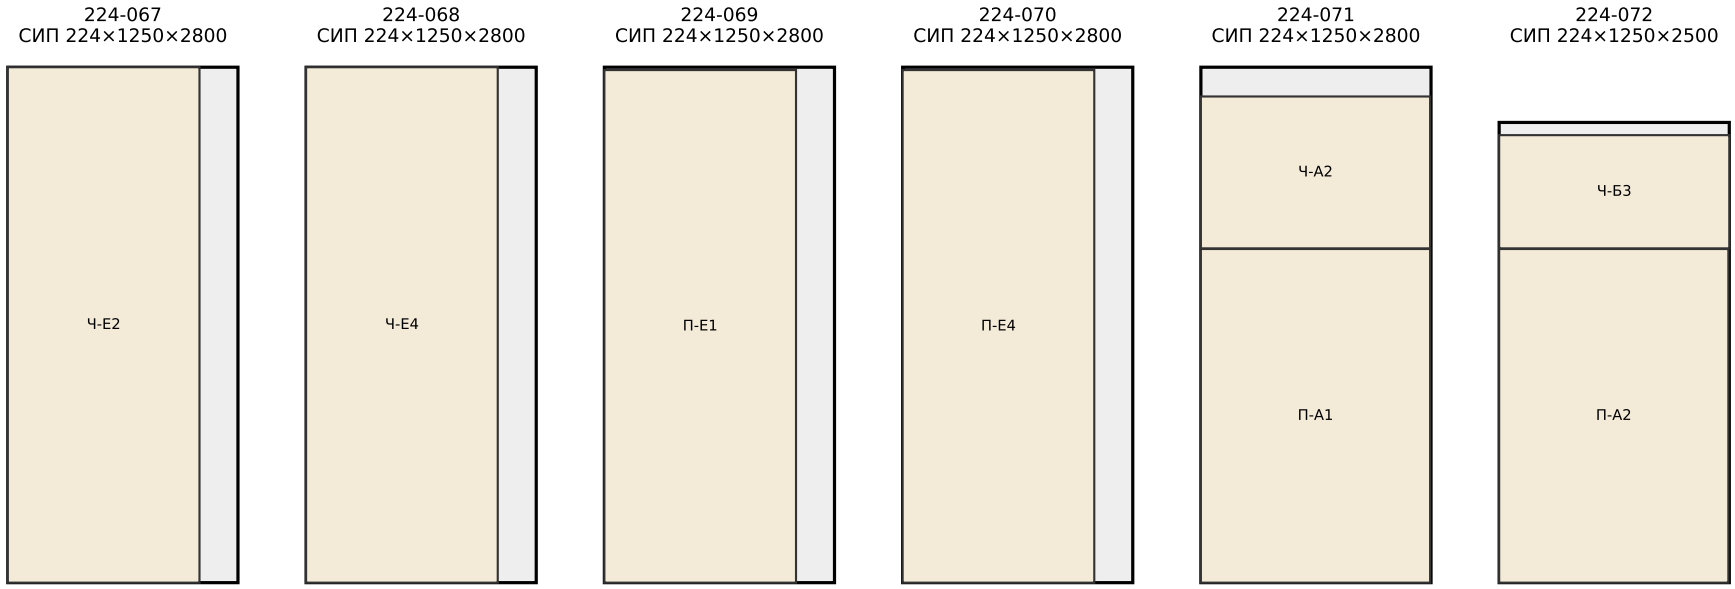


Карта раскроя заготовок

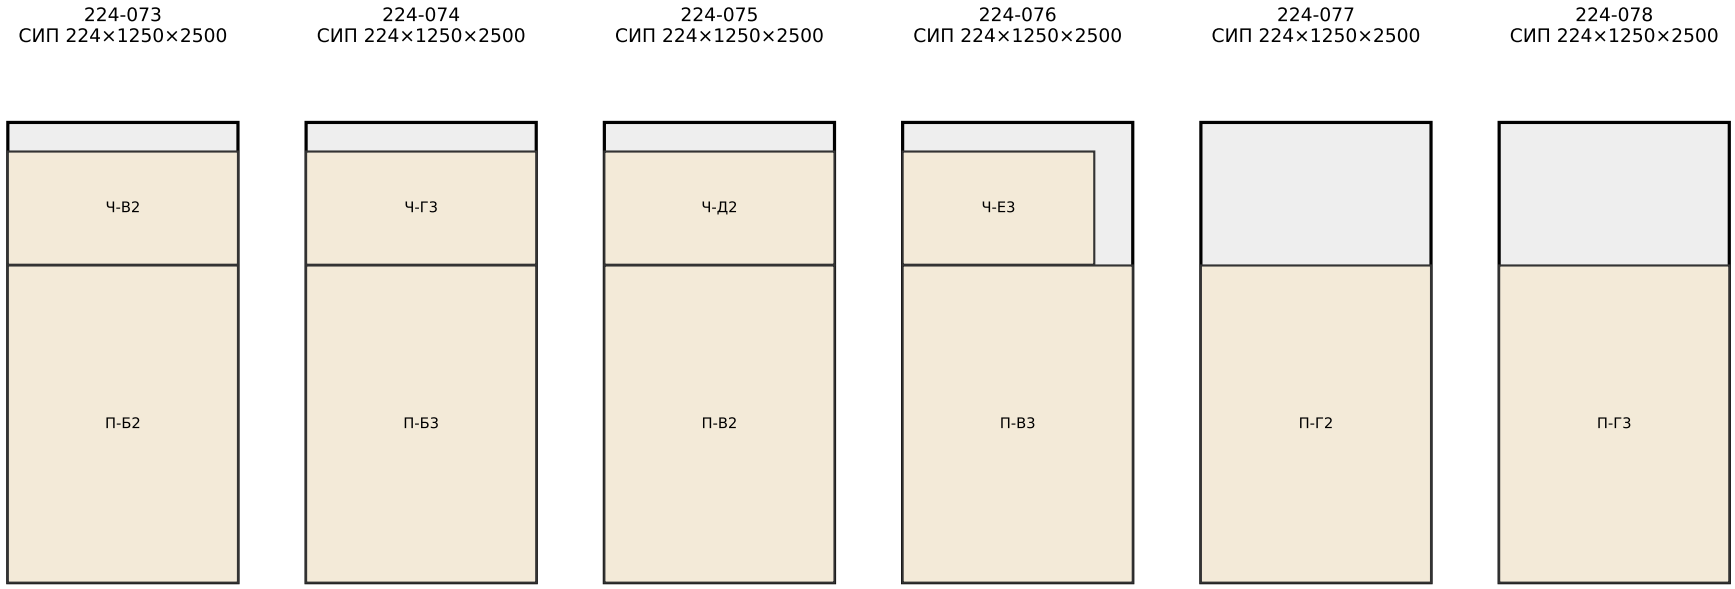


Карта раскроя заготовок


224-079
СИП 224×1250×2500




224-080
СИП 224×1250×2500




224-081
СИП 224×1250×2500



224-082
СИП 224×1250×2500




C1-B-01 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена В (север)




Такие же: C1-B-01, C2-B-01. типовая 1250×2800. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

C1-B-02 · СИП 174 · ×8 шт
1 этаж — Стена В (север)




Такие же: C1-B-02, C1-B-09, C1-1-05, C1-4-04, C2-B-02, C2-B-09, C2-1-03, C2-4-03. типовая 1250×2800. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-B-03 · СИП 174
1 этаж — Стена В (север)




добор по ширине 602 мм; боковая у проёма ОП-5; ВЫБОРКА ПЕНЫ у правой (к ОП-5): паз 25 углубить до 115 на ширину 145 по центру толщины, на всю высоту — сквозные стойки 3×45×145 ОП-5 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C1-B-04 · СИП 174
1 этаж — Стена В (север)




под проёмом ОП-5 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ у верхней кромки (под подоконной ОП-5): паз 25 углубить до 70 на ширину 145 по центру толщины, на всю длину детали 930 — подоконная ОП5-Н 2×45×145 плашмя, верх +2,100 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C1-B-05 · СИП 174
1 этаж — Стена В (север)




добор по ширине 927 мм; боковая у проёма ОП-4, ОП-5; ВЫБОРКА ПЕНЫ у левой кромки (к ОП-5): паз 25 углубить до 115 на ширину 145 по центру толщины, на всю высоту — сквозные стойки 3×45×145 ОП-5 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C1-B-06 · СИП 174
1 этаж — Стена В (север)

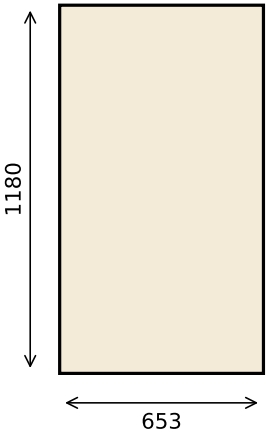


под проёмом ОП-4 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-B-07 · СИП 174
1 этаж — Стена В (север)

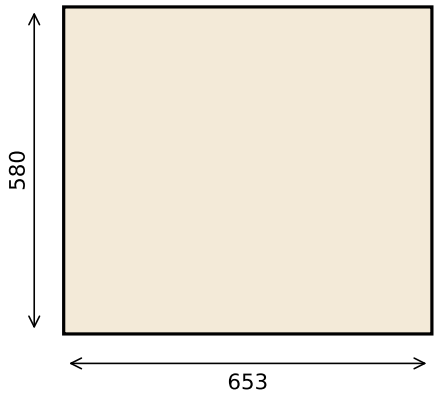


над проёмом ОП-4 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-B-08 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена В (север)




Такие же: C1-B-08, C2-B-08. добор по ширине 628 мм; боковая у проёма ОП-4. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-B-10 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена В (север)




Такие же: C1-B-10, C2-B-10. добор по ширине 1152 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА паз 40 мм

C1-1-01 · СИП 174
1 этаж — Стена 1 (запад)




типовая 1250×2800. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-1-02 · СИП 174
1 этаж — Стена 1 (запад)




добор по ширине 1229 мм; боковая у проёма ОП-7. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C1-1-03 · СИП 174
1 этаж — Стена 1 (запад)

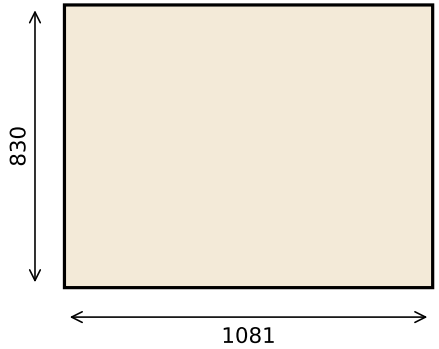


под проёмом ОП-7 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-1-04 · СИП 174
1 этаж — Стена 1 (запад)

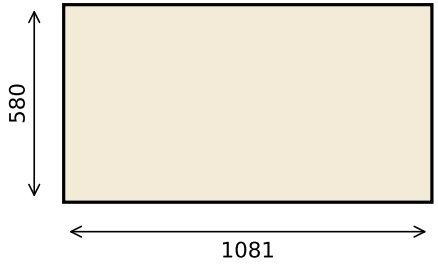


над проёмом ОП-7 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-1-06 · СИП 174
1 этаж — Стена 1 (запад)




добор по ширине 1231 мм. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-4-01 · СИП 174 · ×6 шт
1 этаж — Стена 4 (восток)




Такие же: С1-4-01, С1-4-08, С2-1-01, С2-1-06, С2-4-01, С2-4-06. добор по ширине 1230 мм; боковая у проёма ОП-2. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-4-02 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена 4 (восток)

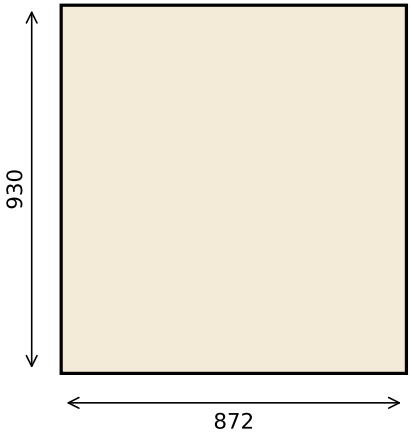


Такие же: С1-4-02, С1-4-06. под проёмом ОП-2 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-4-03 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена 4 (восток)

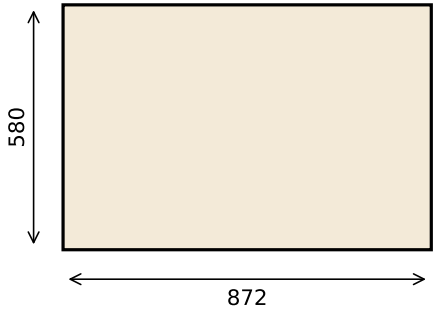


Такие же: С1-4-03, С1-4-07. над проёмом ОП-2 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-4-05 · СИП 174 · ×3 шт
1 этаж — Стена 4 (восток)




Такие же: С1-4-05, С2-1-04, С2-4-04. добор по ширине 582 мм; боковая у проёма ОП-2. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лев 25/25/25/25)

С1-БЗ-01 · СИП 174 · ×8 шт
1 этаж — Стена Б (юг, крыльцо)




Такие же: С1-БЗ-01, С1-БЗ-03, С1-БВ-01, С1-БВ-03, С2-БЗ-01, С2-БЗ-03, С2-БВ-01, С2-БВ-03. добор по ширине 603 мм; боковая у проёма ДП-1. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С1-БЗ-02 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Стена Б (юг, крыльцо)




Такие же: С1-БЗ-02, С1-БВ-02. над проёмом ДП-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-Э2-01 · СИП 174 · ×3 шт
1 этаж — Эркер, бок 2 (запад)




Такие же: С1-Э2-01, С2-Э2-01, С2-Э3-01. типовая 1250×2800. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм

С1-ЭА-01 · СИП 174 · ×4 шт
1 этаж — Эркер, фронт А (юг)




Такие же: С1-ЭА-01, С1-ЭА-03, С2-ЭА-01, С2-ЭА-03. добор по ширине 603 мм; боковая у проёма ОП-1. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-ЭА-02 · СИП 174 · ×2 шт
1 этаж — Эркер, фронт А (юг)




Такие же: С1-ЭА-02, С2-ЭА-02. над проёмом ОП-1 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С1-Э3-01 · СИП 174
1 этаж — Эркер, бок 3 (восток)




типовая 1250×2800; ВЫБОРКА ПЕНЫ у правого торца (у 9,404): паз 25 углубить до 70 на ширину 145 от низа до отм. 2,500 — пакет 2×45×145 (1 стойка в пазу за торцевой доской + 1 изнутри вплотную) под южный конец ригеля Рг-1 ЛВЛ 2×45×300 (по М-5 КР). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); БОКОВАЯ КРОМКА У УГЛА — паз 40 мм; выборка пены — см. примечание

C2-B-03 · СИП 174
2 этаж — Стена В (север)




добор по ширине 602 мм; боковая у проёма ОП-5; ВЫБОРКА ПЕНЫ у правой кромки (к ОП-5): паз 25 углубить до 115 на ширину 145 по центру толщины, на всю высоту — сквозные стойки 3×45×145 ОП-5 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C2-B-04 · СИП 174
2 этаж — Стена В (север)

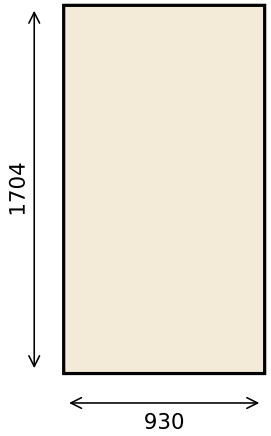


над проёмом ОП-5 (наборный проём); ВЫБОРКА ПЕНЫ у нижней кромки (над перемычкой ОП-5): паз 25 углубить до 175 на ширину 90 по центру толщины, на всю длину детали 930 — перемычка ОП5-П 2×45×195 на ребро, низ +4,100 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C2-B-05 · СИП 174
2 этаж — Стена В (север)




добор по ширине 927 мм; боковая у проёма ОП-4, ОП-5; ВЫБОРКА ПЕНЫ у лево кромки (к ОП-5): паз 25 углубить до 115 на ширину 145 по центру толщины, н всю высоту — сквозные стойки 3×45×145 ОП-5 (по М-9, узел 8 КР-38). Кромки паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

C2-B-06 · СИП 174
2 этаж — Стена В (север)

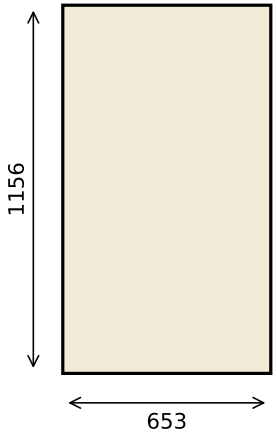


под проёмом ОП-4 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C2-B-07 · СИП 174
2 этаж — Стена В (север)

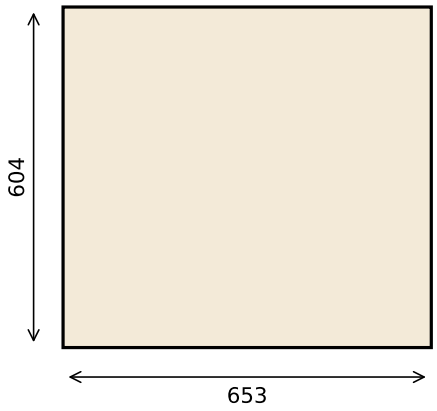


над проёмом ОП-4 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

C2-1-02 · СИП 174 · ×4 шт
2 этаж — Стена 1 (запад)

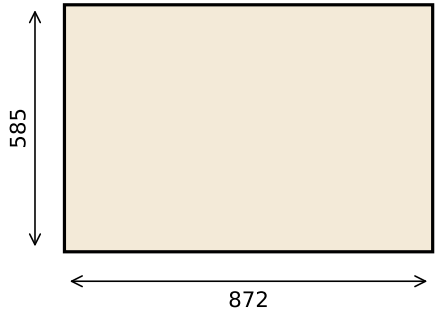


Такие же: C2-1-02, C2-1-05, C2-4-02, C2-4-05. над проёмом ОП-3 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

С2-Б3-02 · СИП 174 · ×2 шт
2 этаж — Стена Б (юг, крыльцо)




Такие же: С2-Б3-02, С2-БВ-02. над проёмом ОП-6 (наборный проём). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

П-А1 · СИП 224 · ×2 шт
Пол 1 этажа

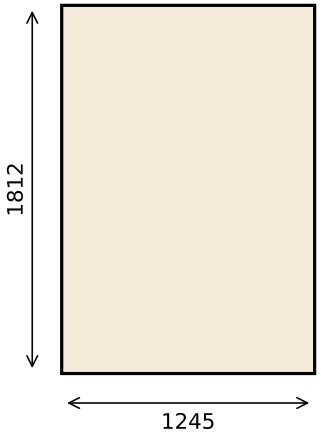


Такие же: П-А1, П-А2. панель 1245×1812 (эркер: 1245); короткие швы 5 мм — над рядами обвязки x 75,850 / 77,578 / 79,306; швы 75,850 / 79,306 под несущими стенами — вкладыш 3×45×195 в выборке 65 (М-7); ВЫБОРКА 160 (М-11): у наружных кромок — западная (торец); южная (длинная) — выборка пены 160 на высоту 195 вместо паза 25 (доска 20×195 + пакет 3×45×195 под наружной стеной). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); наружные кромки (западная (торец); южная (длинная)) — выборка 160 (М-11) на высоту 195 вместо паза 25; выборка пены — см. примечание

П-Б1 · СИП 224 · ×8 шт
Пол 1 этажа




Такие же: П-Б1, П-Б4, П-В1, П-В4, П-Г1, П-Г4, П-Д1, П-Д4. панель 1250×2784 (целая ширина 1250); короткие швы 5 мм — над рядами обвязки x 75,850 / 77,578 / 79,306; швы 75,850 / 79,306 под несущими стенами — вкладыш 3×45×195 в выборке 65 (М-7); ВЫБОРКА 65 (М-7): у короткой кромки (конец (восток)) выборка пены 65 на высоту 195 по всей ширине вместо паза 25 — вкладыш 3×45×195 под несущей стеной, ОСП до шва; ВЫБОРКА 160 (М-11): у наружных кромок — западная (торец); южная (длинная) — на участке 0...2700 от западного торца, остальное — шов с панелью эркера — выборка пены 160 на высоту 195 вместо паза 25 (доска 20×195 + пакет 3×45×195 под наружной стеной). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); наружные кромки (западная (торец); южная (длинная) — на участке 0...2700 от западного торца, остальное — шов с панелью эркера) — выборка 160 (М-11) на высоту 195 вместо паза 25; короткая кромка конец (восток) — выборка 65 (М-7) на высоту 195 вместо паза 25; выборка пены — см. примечание

П-Б2 · СИП 224 · ×8 шт
Пол 1 этажа

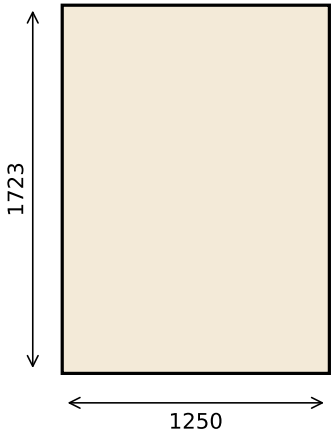


Такие же: П-Б2, П-Б3, П-В2, П-В3, П-Г2, П-Г3, П-Д2, П-Д3. панель 1250×1723 (целая ширина 1250); короткие швы 5 мм — над рядами обвязки x 75,850 / 77,578 / 79,306; швы 75,850 / 79,306 под несущими стенами — вкладыш 3×45×195 в выборке 65 (М-7); ВЫБОРКА 65 (М-7): у короткой кромки (начало (запад)) выборка пены 65 на высоту 195 по всей ширине вместо паза 25 — вкладыш 3×45×195 под несущей стеной, ОСП до шва. Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); короткая кромка начало (запад) — выборка 65 (М-7) на высоту 195 вместо паза 25; выборка пены — см. примечание

П-Е1 · СИП 224 · ×2 шт
Пол 1 этажа




Такие же: П-Е1, П-Е4. панель 1041×2784 (добор по ширине у стены В); короткие швы 5 мм — над рядами обвязки x 75,850 / 77,578 / 79,306; швы 75,850 / 79,306 под несущими стенами — вкладыш 3×45×195 в выборке 65 (М-7); ВЫБОРКА 65 (М-7): у короткой кромки (конец (восток)) выборка пены 65 на высоту 195 по всей ширине вместо паза 25 — вкладыш 3×45×195 под несущей стеной, ОСП до шва; ВЫБОРКА 160 (М-11): у наружных кромок — западная (торец); северная (длинная) — выборка пены 160 на высоту 195 вместо паза 25 (доска 20×195 + пакет 3×45×195 под наружной стеной). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); наружные кромки (западная (торец); северная (длинная)) — выборка 160 (М-11) на высоту 195 вместо паза 25; короткая кромка конец (восток) — выборка 65 (М-7) на высоту

П-Е2 · СИП 224 · ×2 шт
Пол 1 этажа

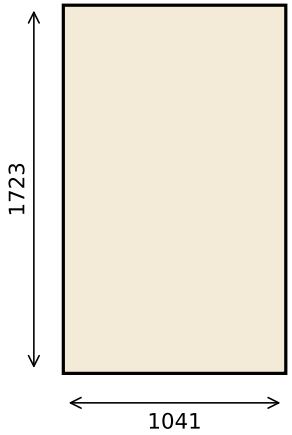


Такие же: П-Е2, П-Е3. панель 1041×1723 (добор по ширине у стены В); короткие швы 5 мм — над рядами обвязки x 75,850 / 77,578 / 79,306; швы 75,850 / 79,306 под несущими стенами — вкладыш 3×45×195 в выборке 65 (М-7); ВЫБОРКА 65 (М-7): у короткой кромки (начало (запад)) выборка пены 65 на высоту 195 по всей ширине вместо паза 25 — вкладыш 3×45×195 под несущей стеной, ОСП до шва; ВЫБОРКА 160 (М-11): у наружных кромок — северная (длинная) — выборка пены 160 на высоту 195 вместо паза 25 (доска 20×195 + пакет 3×45×195 под наружной стеной). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); наружные кромки (северная (длинная)) — выборка 160 (М-11) на высоту 195 вместо паза 25; короткая кромка начало (запад) — выборка 65 (М-7) на высоту 195 вместо паза 25;

Ч-А1 · СИП 224
Чердачное перекрытие




панель 1245×2800 (эркер: 1245); эркер: короткий шов вне опор — держат доски длинных швов; ВЫБОРКА ПЕНЫ М-10 (под мауэрлат): длинная нижняя (юг) 2800, короткая левая (запад) 1245 — паз 25 углубить до 160 на высоту 195 (между ОСП), замыкающая доска 20×195 + пакет 3×45×195 (дерево 155 ≥ 145). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

Ч-А2 · СИП 224
Чердачное перекрытие

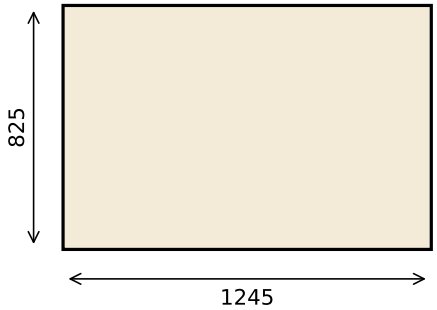


панель 1245×825 (эркер: 1245); эркер: короткий шов вне опор — держат доски длинных швов; ВЫБОРКА ПЕНЫ М-10 (под мауэрлат): длинная нижняя (юг) 825, короткая правая (восток) 1245 — паз 25 углубить до 160 на высоту 195 (между ОСП), замыкающая доска 20×195 + пакет 3×45×195 (дерево 155 ≥ 145). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

Ч-Б1 · СИП 224 · ×12 шт
Чердачное перекрытие




Такие же: Ч-Б1, Ч-Б2, Ч-Б4, Ч-В1, Ч-В3, Ч-В4, Ч-Г1, Ч-Г2, Ч-Г4, Ч-Д1, Ч-Д3, Ч-Д4. панель 1250×2800 (целая ширина 1250); от наружной стены до несущей стены 2 эт. (опора ≥ 70 на каркас 145); ВЫБОРКА ПЕНЫ М-10 (под мауэрлат): длинная нижняя (юг) 2700, короткая левая (запад) 1250 — паз 25 углубить до 160 на высоту 195 (между ОСП), замыкающая доска 20×195 + пакет 3×45×195 (дерево 155 ≥ 145). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

Ч-Б3 · СИП 224 · ×4 шт
Чердачное перекрытие




Такие же: Ч-Б3, Ч-В2, Ч-Г3, Ч-Д2. панель 1250×615 (целая ширина 1250); средняя зона 75,868…79,288 — короткий шов вразбежку, держат доски длинных швов БП-1 (пролёт 3,44 между стенами x 75,864 / 79,306). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25)

Ч-Е1 · СИП 224 · ×3 шт
Чердачное перекрытие



Такие же: Ч-Е1, Ч-Е2, Ч-Е4. панель 1041×2800 (добор по ширине у стены В); от наружной стены до несущей стены 2 эт. (опора ≥ 70 на каркас 145); ВЫБОРКА ПЕНЫ М-10 (под мауэрлат): длинная верхняя (север) 2800, короткая левая (запад) 1041 — паз 25 углубить до 160 на высоту 195 (между ОСП), замыкающая доска 20×195 + пакет 3×45×195 (дерево 155 ≥ 145). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание

Ч-Е3 · СИП 224
Чердачное перекрытие

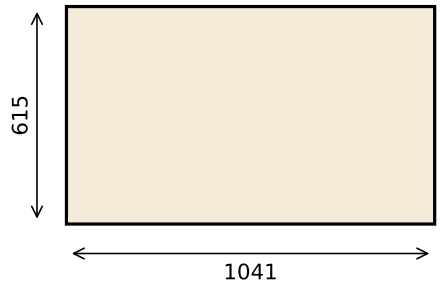

панель 1041×615 (добор по ширине у стены В); средняя зона 75,868…79,288 — короткий шов вразбежку, держат доски длинных швов БП-1 (пролёт 3,44 между стенами x 75,864 / 79,306); ВЫБОРКА ПЕНЫ М-10 (под мауэрлат): длинная верхняя (север) 615 — паз 25 углубить до 160 на высоту 195 (между ОСП), замыкающая доска 20×195 + пакет 3×45×195 (дерево 155 ≥ 145). Кромки: паз 25 по всем кромкам (выборка низ/право/верх/лево: 25/25/25/25); выборка пены — см. примечание
