Фасад 1-5

HAUBERK нетто 26,48 м² → ≈ 284 плиток

рядов 40 по 100 мм от цокольной планки ±0,000

ОП-02 1888×1806: наличник 50×100 по периметру, отлив

ДП-01 1000×2100: наличник 50×100 по периметру, отлив

ОП-01 1095×1300: наличник 50×100 по периметру, отлив

ОП-02 1888×1806: наличник 50×100 по периметру, отлив

Прага — Фасад в осях 1-5 (фронтон Б, вход и крыльцо)
ВАРИАНТ «HAUBERK — как в ЭП»: плитка HAUBERK «Кирпич» на весь дом



HAUBERK — прямо по ОСП СИП, ряд 100 мм (кирпич показан условно).
Цоколь — отдельно (Ц1).

Фасад 5-1

HAUBERK нетто 21,52 м² → ≈ 231 плиток

рядов 40 по 100 мм от цокольной планки ±0,000

ОП-02 1888×1806: наличник 50×100 по периметру, отлив

ОП-03 1570×2700: наличник 50×100 по периметру, отлив

ДП-02 1570×2700: наличник 50×100 по периметру, отлив

ОП-02 1888×1806: наличник 50×100 по периметру, отлив

Прага — Фасад в осях 5-1 (фронтон E, терраса)
ВАРИАНТ «HAUBERK — как в ЭП»: плитка HAUBERK «Кирпич» на весь дом



HAUBERK — прямо по ОСП СИП, ряд 100 мм (кирпич показан условно).
Цоколь — отдельно (Ц1).


Фасад А-Ж

HAUBERK нетто 20,60 м² → ≈ 221 плиток

рядов 25 по 100 мм от цокольной планки ±0,000

ОП-04 630×1300: наличник 50×100 по периметру, отлив

Прага — Фасад в осях А-Ж (карнизная стена 5)
ВАРИАНТ «HAUBERK — как в ЭП»: плитка HAUBERK «Кирпич» на весь дом

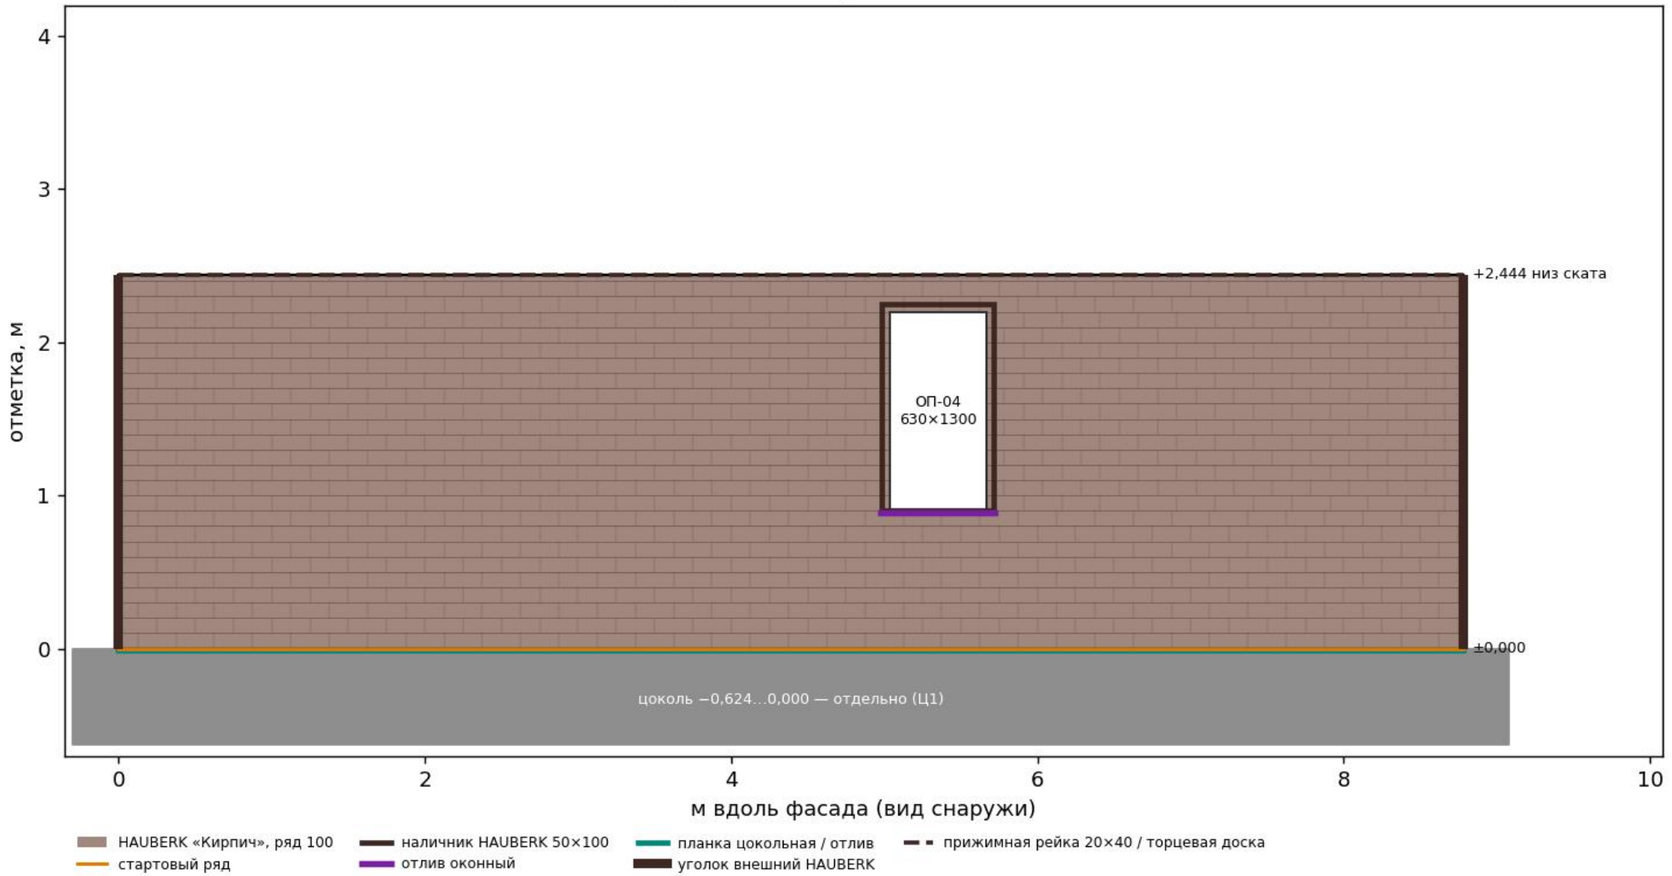


HAUBERK — прямо по ОСП СИП, ряд 100 мм (кирпич показан условно).
Цоколь — отдельно (Ц1).

Фасад Ж-А

HAUBERK нетто 21,42 м² → ≈ 230 плиток

рядов 25 по 100 мм от цокольной планки ±0,000

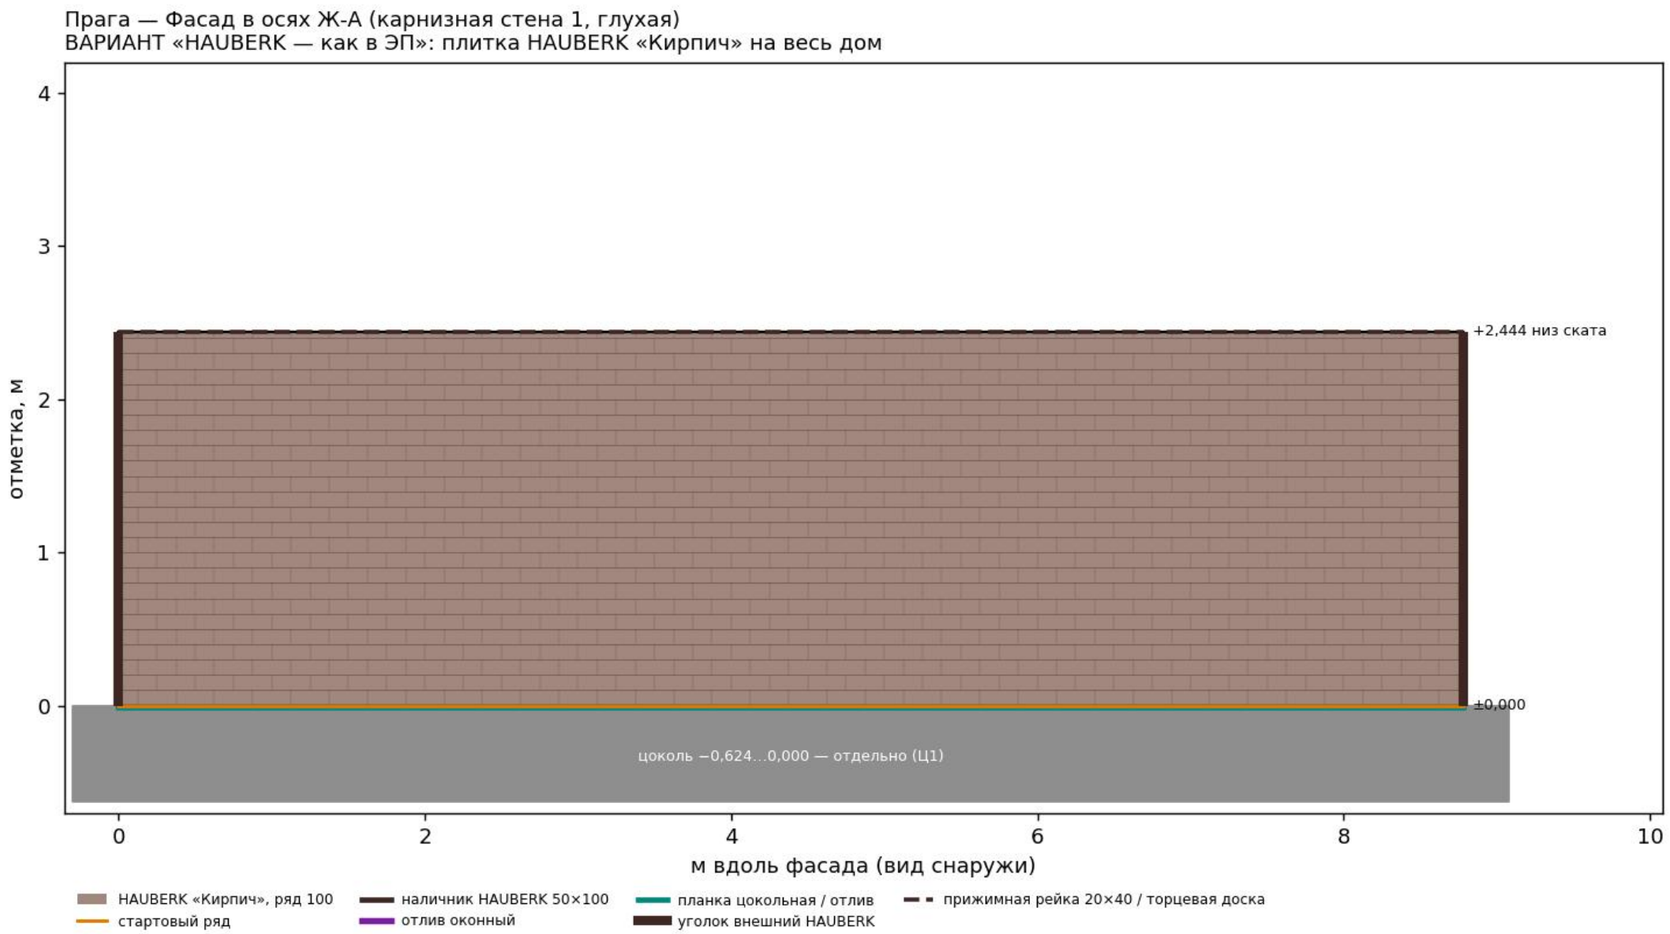

HAUBERK — прямо по ОСП СИП, ряд 100 мм (кирпич показан условно).
Цоколь — отдельно (Ц1).
